


Prosjektrapport

BrubyggerBygda Bjøneroa

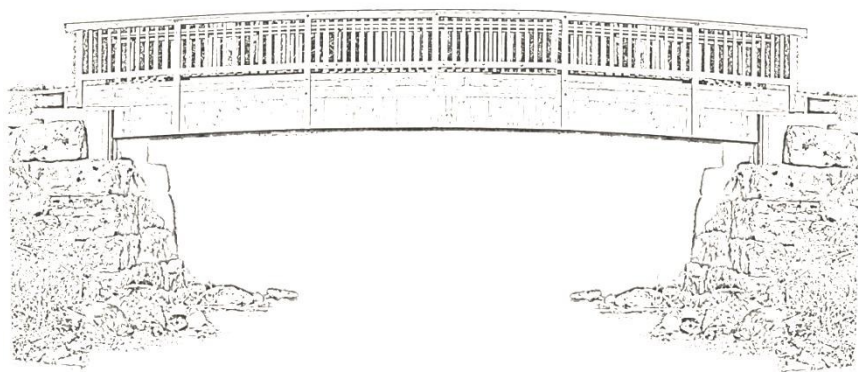

2008 – 2013

8. januar 2014





Innhold

1 Sammenheng.....	5
2 Bakgrunn.....	5
2.1 Initiativ.....	5
2.2 Visjon og verdier.....	6
2.3 Målsetninger.....	7
2.4 Rammer.....	7
3 Organisering.....	8
3.1 Prosjektorganisasjon.....	8
3.2 Roller og oppgaver.....	9
4 Fokusområder og tiltak.....	9
4.1 Utviklingsskisse.....	10
4.2 Boligstruktur.....	11
4.3 Stedsutvikling.....	12
4.4 Omdømme.....	15
4.5 Samferdsel.....	19
4.6 Bredbånd.....	20
4.7 Helse og beredskap.....	20
4.8 Kultur og trivsel.....	21
5 Økonomi.....	22
5.1 Budsjett og forbruk.....	22
5.2 Finansiering.....	23
5.3 Gjenstående midler.....	24
5.4 Økonomistyring.....	24
6 Resultater og vurderinger.....	25
6.1 Måloppnåelse.....	25
6.2 Vurdering av effekt.....	27
6.3 Videre anbefalinger.....	28
6.4 Konklusjon.....	29
Vedlegg.....	31



1 Sammendrag

Bjonerøa er ei bygd med mye frivillig initiativ, store utfordringer i forhold til avstandsulempen, grunnlag for offentlige tjenestetilbud og sysselsetting/næring. Ambisjonen med småsamfunnsprosjektet i Bjonerøa har vært utvikling av lokalsamfunnet, med mål om å snu en langsiktig negativ befolkningsutvikling. I perioden 2008-2013 har Oppland fylkeskommune, Gran kommune og Forum Bjonerøa samarbeidet om dette.

Følgende tiltaksområder har vært i fokus, med ulik vektlegging, innsats og resultat:

- Utviklingsskisse
- Boligstruktur
- Stedsutvikling
- Omdømme
- Samferdsel
- Bredbånd
- Helse og beredskap
- Kultur og fritid

Småsamfunnsprosjektet har løftet det frivillige engasjementet i Bjonerøa i forhold til lokalsamfunnsutvikling. Langsiktige resultater av dette er det for tidlig å måle, men i rapporten vil gjennomførte tiltak, og virkningen av disse, belyses og drøftes.

2 Bakgrunn

2.1 Initiativ

Bjonerøa er et lokalsamfunn i Gran kommune med ca 450 innbyggere. Småsamfunnsprosjektet i Bjonerøa har vært et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Gran kommune og Forum Bjonerøa i perioden 2008-2013. Formell oppstart var i desember 2007 og kick-off ble arrangert i februar 2008. Prosjektet har utvikling av lokalsamfunnet Bjonerøa som formål. Det spesielle med Bjonerøas småsamfunnsprosjekt er at det er fullstendig initiert fra lokalmiljøet og innbyggerne, og dermed har en tydelig lokal forankring. Dette er et typisk "nedenfra-og-opp-initiativ" hvor frivillig innsats forsterkes og underbygges med støtte og drahjelp fra det offentlige.

Utgangspunktet for prosjektet har vært et ønske om å jobbe med disse grunnleggende utfordringene:

- Bjonerøas innbyggertall har, over tid, utviklet seg negativt. Derfor er innflytting svært ønskelig, men bygda har få ledige boliger å tilby.
- Bjonerøa har mye å tilby sine innbyggere, men befolkningsgrunnlaget kan være i minste laget for å opprettholde gode tjenestetilbud
- Avstandsulempen er en utfordring i ei bygd som er utkant både i kommune og fylke
- Folk i Bjonerøa er gode på frivillighet, men har mye å hente på å skape økonomisk fortjeneste.




For å videreutvikle lokalsamfunnet Bjonerøa, må det jobbes med å gjøre bygda attraktiv for etablering, investeringer og kompetansetilførsel

Med tanke på den sammensatte problematikken dette prosjektet har sin bakgrunn i, har det vært svært viktig å knytte til seg et nettverk av personer og virksomheter innen ulike kompetanseområder. Derfor har privatpersoner, næringsdrivende, offentlige og frivillige virksomheter i lokalsamfunnet vært involvert på mange forskjellige måter. Småsamfunnsprosjektet har bidratt til bedre forståelse for Bjøneroas utfordringer. Det har vært viktig å ha god dialog med kommunale virksomheter i forbindelse med gjennomføring av tiltak. Oppland fylkeskommune har også vært en naturlig samarbeidspartner, med sin lange erfaring med tilsvarende prosjekter.

2.2 Visjon og verdier

I oppstartsfasen, ble behovet for en tydelig strategi rundt omdømmebygging svært framtrødende. Hele prosjektorganisasjonen var på let etter begreper som kunne fungere i forhold til prosjektets konkrete mål og tiltak. Det ble viktig å tenke igjennom alle sider ved prosjektet og forhold ved Bjøneroa som lokalsamfunn. Sagt på en annen måte: Bjøneroa trengte en visjon, noe å strekke seg etter, noe å stå for. Det ble tidlig i prosessen klart at vi trengte litt drahjelp – en litt annen måte å tenke på. Dermed kom oppmuntringssaken inn i bildet. Inspirert av et helt tankesett knyttet til oppmuntring, har småsamfunnsprosjektet forsøkt å finne sin egen vri på det hele.

Med holdnings- og omdømmearbeid som overordnet fokusområde, og med *oppmuntring* som verktøy, ble visjonen **"BrubyggerBygda Bjøneroa"** lansert. Begrepet ble valgt både på grunn av sitt konkrete og sitt abstrakte innhold. Veldig mye av utviklingen i lokalsamfunnet kan knyttes direkte mot enten en materiell eller mental dimensjon. Sammen med visjonen hører også et verdisett:

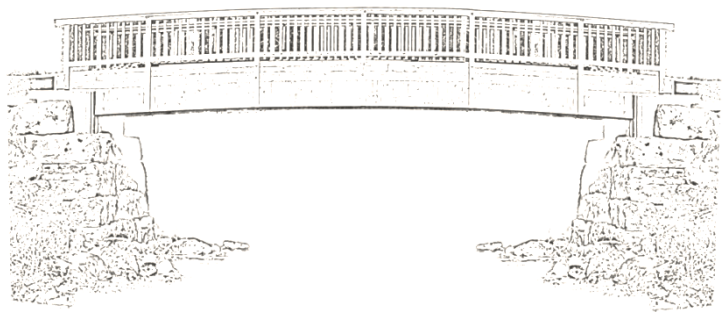

BrubyggerBygda Bjøneroa

- Mental brubygging mellom mennesker med oppmuntring som verktøy
- Fysisk bygging av små og store bruer i nærområdet
- Samfunnsmessig brubygging med inkludering og samarbeid på tvers av alle nivåer

Overordnede verdier for Bjøneroa

B – Begeistring

R – Raushet

U – Utholdenhet

Visjon og verdier ble til underveis, etter at man hadde tatt noen veivalg i forhold til prosjektets innhold, i overgangen til fase 2 av prosjektet. Visjonen peker indirekte på utfordringene for lokalsamfunnet Bjøneroa. Det har derfor vært viktig å holde fokus på en hovedmålsetning.

2.3 Målsetninger

Med den bakgrunnen som er beskrevet, har småsamfunnsprosjektet i Bjøneroa hatt som formål å snu en langsiktig negativ befolkningsutvikling - i et lokalsamfunn med mye frivillig initiativ, store utfordringer i forhold til avstandsulemper, grunnlag for offentlige tjenestetilbud og sysselsetting/næring. Oppsummert ble derfor hovedmålsettingen formulert slik:

Hovedmålet med et småsamfunnsprosjekt i Bjøneroa er å ta i bruk bygdas potensial og skape positiv befolkningsutvikling.

Tiltakene i prosjektet har dermed hatt fokus på å bygge videre på positive verdier i lokalsamfunnet, gjøre bygda attraktiv for de som bor der og dermed legge til rette for at flere ønsker å flytte dit. Dette ga følgende delmål:

- Bjøneroa skal bli verdens første oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn
- Bjøneroa skal utgjøre en forskjell ved å bygge bruer og relasjoner, menneskelig og samfunnsmessig
- Bjøneroa skal bli ei enda bedre bygd å bo i og et enda bedre sted å besøke

2.4 Rammer

Småsamfunnsprosjektets opprinnelige tidsramme var oppstartsperioden i siste halvdel av 2007 og prosjektårene 2008-2010. I 2010 ble fase 2 lagt fram til politisk behandling og prosjektet ble forlenget med to år. Ved utgangen av 2012 ble ytterligere ett år lagt til, av hensyn til en del tiltak som ikke var i mål. Den totale prosjektperioden regnes fra 2008 til utgangen av 2013.

Gjennom kommunestyrets vedtak i juni 2007 ble det bevilget 100.000 kr til oppstartsfasen. Deretter er det bevilget 200.000 årlig i perioden 2008-2013, gjennom avsetning i budsjett og økonomiplan. Oppland fylkeskommune har bidratt med 200.000 kr årlig gjennom hele perioden, ved bruk av regionale utviklingsmidler.

I løpet av prosjektet har det blitt skaffet tilleggsfinansiering fra flere kilder. Det er viktig å få fram at lokalsamfunnet Bjøneroas bidrag også har en økonomisk verdi. På den finansielle siden har Forum Bjøneroa brukt av egne innsamlede midler i flere av tiltakene og er dermed med i spleiselaget både med penger og et betydelig antall dugnadstimer. Andre lag og foreninger har også bidratt med midler knyttet til konkrete tiltak som inngår i småsamfunnsprosjektet.

Prosjektleder har vært ansatt i 20% stilling første halvår, deretter 35% i resten av prosjektperioden. Arbeidsinnsatsen for øvrig har vært basert på frivillighet. Mange innbyggere i Bjøneroa har bidratt gjennom deltakelse i arbeidsgrupper, i forbindelse med arrangementer og i dugnader.


3 Organisering

3.1 Prosjektorganisasjon

Forum Bjonerøa har vært initiativtaker og lokal operatør for småsamfunnsprosjektet, som har vært eid av Gran kommune. Det har noen ganger vært vanskelig å definere skillelinjene mellom det frivillige laget Forum Bjonerøa og det kommunale småsamfunnsprosjektet. Det er nok i stor grad slik at både publikum og deltakere oppfatter Forum Bjonerøa og småsamfunnsprosjektet som en og samme ting. Likevel må det kunne sies at alle involverte parter har tilstrebet ryddighet i forhold til dette.

Forum Bjonerøas ordinære virksomhet involverer tiltak som har vært en viktig støtte for småsamfunnsprosjektet. Det er grunn til å nevne drift av nettstedet bjonerøa.no og profilering- og informasjonsarbeid forøvrig. I tillegg står Forum Bjonerøa bak en del sosiale, trivselsskapende og utviklende tiltak som ikke nødvendigvis er en del av prosjektet. Forum Bjonerøa jobber også med saksområder som ikke inngår i småsamfunnsprosjektet.

Prosjektorganisasjonen består av prosjekteier, prosjektansvarlig, styringsgruppe, referansegruppe, prosjektleder og arbeidsgrupper. Sammenhengen mellom disse og forholdet til Forum Bjonerøa er skissert i modellen under:

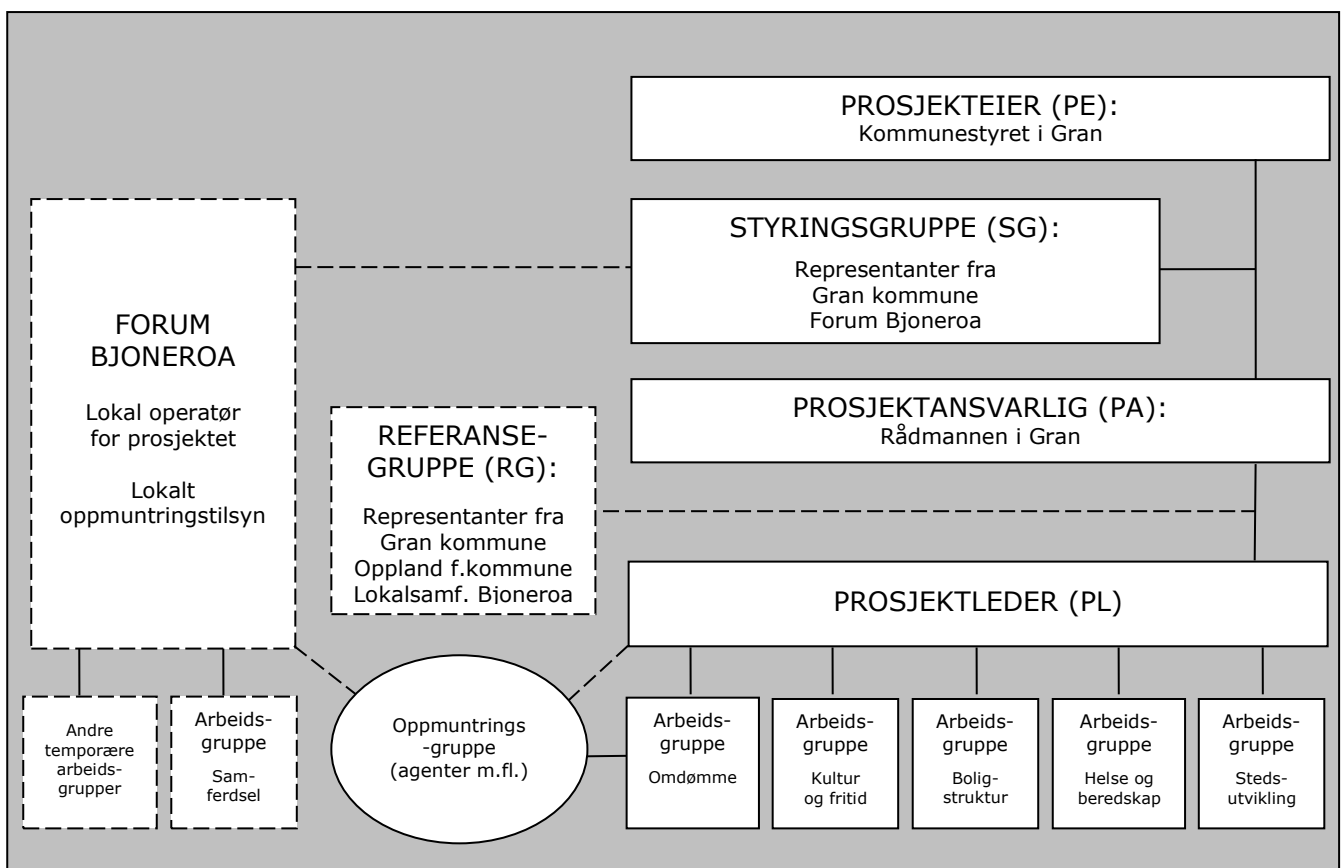

Det har vært viktig å involvere prosjekteier underveis. Gjennom prosjektperioden har det blitt gjennomført 4 orienteringer om småsamfunnsprosjektet i kommunestyret (juni 2008, september 2009, september 2011 og desember 2012). I tillegg har kommunestyret møtt prosjektet gjennom politisk behandling av saker knyttet til prosjektet, blant annet plansaker.

3.2 Roller og oppgaver

Styringsgruppa har representanter fra politisk og administrativt nivå i kommunen og fra Bjøneroa. Gjennom hele prosjektperioden har styringsgruppa bestått av ordføreren, rådmannen eller rådmannens representant og et styremedlem fra Forum Bjøneroa. Styringsgruppa har stått ansvarlig for utviklingen. Økonomiske disposisjoner og strategiske valg har blitt godkjent av styringsgruppa. Gjennom perioden har det blitt avholdt 24 styringsgruppemøter og behandlet 200 saker. Styringsgruppas funksjon har vært å sørge for:

- at prosjektleders mål er klart definert og i samsvar med behov
- at prosjektleder får den støtte som trengs for å utføre arbeidet
- at prosjektet har en klar kostnads- og tidsramme og at denne rammen blir respektert
- at nødvendige styringsmessige beslutninger blir fattet gjennom prosjektets gang for å sikre at mål og rammer blir nådd
- at prosjektets målsetning blir evaluert
- at prosjektleder rapporterer underveis og ved avslutning
- at prosjektet blir avsluttet

En referansegruppe, bestående av ulike ressurspersoner, har fulgt prosjektet. Dens funksjon har vært å bidra med konstruktive innspill og faglige råd til prosjektleder og styringsgruppe. Referansegruppa har også fungert som bindeledd i forhold til eget nettverk. Referansegruppa har møttes til sammen 9 ganger og behandlet 59 saker.



Diskusjon i arbeidsgrupper, april 2008

Prosjektleder har hatt en koordinerende og utførende rolle i prosjektet. Arbeidet har bestått av administrative oppgaver som oppfølging av økonomi og organisering av møter, informasjon og kommunikasjon, gjennomføring av tiltak og oppfølging av arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppene har jobbet med ulike temaer og har samlet frivillige som har ønsket å engasjeres seg i forhold til spesielle saker. Deltakerne har blitt organisert ut fra kompetanse og interesse. Aktivitetene har vært styrt av deltakernes initiativ. Det har vært et viktig prinsipp i et prosjekt som har sin forankring hos innbyggerne selv. Hver gruppe har hatt en kontaktperson. Arbeidsgruppene har rapportert til styringsgruppa via prosjektleder.

4 Fokusområder og tiltak

Tiltakene, som det har vært jobbet med i småsamfunnsprosjektet, har alle hatt fokus på gode tjenester og velferdstilbud, utvikling av et attraktivt lokalsamfunn og omdømmebygging. Det er satt i gang mange positive tiltak og lokalsamfunnet Bjøneroa har fått muligheter til å jobbe med sine utfordringer på en ny måte. Småsamfunnsprosjektet kan også beskrives som en dynamisk prosess - med et såpass fleksibelt handlingsrom at det har vært mulig å justere kursen underveis.

Innbyggerne i Bjøneroa har hatt direkte påvirkning i forhold til hvilke saker det har blitt fokusert på. Ved Kick-off i 2008, som var organisert som et åpent folkemøte, kunne alle frammøtte melde seg til innsats ut i fra sine interesser. Dette dannet grunnlag for videre prioritering av fokusområder. Dette førte til at til sammen 7 arbeidsgrupper ble igangsatt. Disse fikk gjennom idemyldringer utforme hvert sitt tiltaksområde. I tillegg fikk tiltaksplanen et overordnet tiltaksområde. Tiltaksplanen, som forelå etter idemyldringsperioden våren 2008, ble forholdsvis ambisiøs. Resultatene må vurderes i lys av dette. Det har vært en klar prioritering i prosjektledelsen, at de tiltaksområdene og arbeidsgruppene som har vist mest initiativ, har blitt viet mest oppmerksomhet.

Ved overgangen til fase 2 i 2010, ble tiltaksplanen omarbeidet og noen fokusområder og tiltak ble utfaset fra prosjektplanen. Dette var for å spisse innsatsen på grunnlag av de erfaringer man hadde gjort seg så langt. Det viste seg naturlig å la noen tiltaksområder videreføres utenfor prosjektet.

Overordnet tiltak:

- Utviklingsskisse

Fokusområder med arbeidsgrupper:

- Boligstruktur
- Stedsutvikling
- Omdømme
- Samferdsel
- Bredbånd
- Helse og beredskap
- Kultur og fritid

4.1 Utviklingsskisse

Flere av temaene som ble diskutert ved oppstarten av prosjektet, ville utløse behov for planavklaringer i forhold til utvikling av nye boligområder, tiltak i strandsona til Randsfjorden og Bjønrelva, næringsutvikling og utvikling av offentlig virksomhet. Det ble derfor tidlig tatt initiativ til at småsamfunnsprosjektet skulle delta i prosessen rundt rullering av Gran kommunes arealplan. Det er første gang det er kjørt en helhetlig prosess rundt dette i Bjøneroa.

Styringsgruppa satte i gang et samarbeid med ekstern konsulent innen arealplanlegging. Bestillingen var en «stedsutviklingsskisse» som skulle tjene flere formål:

- Skissere både "drømmeprosjekter" og realistiske utvalgte tiltak for Bjøneroa på kort og lang sikt
- Brukes som felles innspill fra Bjøneroa i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.
- Danne grunnlag for prosjektering av konkrete stedsutviklingstiltak som badeplass/friområde og standpromenade/tursti.

Innholdet i stedsutviklingsskissen ble førende for arbeid innen flere tiltaksområder. Den ble utviklet i en prosess med åpne arealseminarer, dialog med grunneiere, innspill fra arbeidsgrupper, referansegruppe og styringsgruppe. I tillegg har det vært flere avklaringsrunder i forhold til overordnede planmyndigheter.

Link til stedsutviklingsskissen følger i vedlegg 1, lenke 2.

De nødvendige arealavklaringer, man hadde håpet å få på plass, kom ikke i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. I Bjøneroa ble det aktuelle området avsatt

som hensynssone med krav om områderegulering. En slik prosess ville bli for omfattende til å kjøres gjennom småsamfunnsprosjektet, både i forhold til arbeidskapasitet og økonomi.



Arealseminar med innspill til utviklingsskisse for Bjøneroa og rullering av kommuneplanens arealdel ble holdt i to omganger, mai og august 2008.



Avklaringer i forhold til kommuneplanens arealdel og stedsutviklingstiltak. Befaring med representanter fra kommune, fylkeskommune og fylkesmann, september 2009.

Dermed tok Forum Bjonerøa i september 2010 initiativ til en politisk behandling av behovet for områderegulering, slik at de prosessene som var satt i gang, ikke skulle stoppe opp. Kommunestyret vedtok å sette i gang en områderegulering og finansierte tiltaket. Det er Gran kommunes planavdeling som har ansvar for denne prosessen. Fra småsamfunnsprosjektets side har prosjektleder deltatt i noen arbeidsmøter om saken, for å få til en god samordning i forhold til det som er gjort tidligere. Prosjektleder har også bidratt med tilrettelegging av møter i Bjonerøa i forbindelse med saken. For øvrig er det planavdelingen som har ansvar for innholdet og de avklaringer som må gjøres i forhold til grunneiere og involverte parter.

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 16. februar 2012. Kommunens planutvalg vedtok 27. november 2013 å legge forslag til områdereguleringsplan for Bjonerøa ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 29. januar 2014. Det er grunn til å anta at sluttbehandling i kommunestyret vil bli i april/mai 2014. Link til dokumenter i saken finnes i vedlegg 1, lenke 3.

Hva som kommer konkret ut av denne saken, vil vi først se etter at småsamfunnsprosjektet er avviklet. For småsamfunnsprosjektet har det vært viktig å jobbe med langsiktige utviklingsperspektiver. Da er det nødvendig å delta i formelle planprosesser. Områdereguleringen har vært en viktig, men krevende, prosess. Siden det er kommunens planavdeling som har ansvar for gjennomføring av områdereguleringen, vil prosessen gå sin gang uavhengig av småsamfunnsprosjektet.

Områdereguleringen har tatt mer tid enn forutsatt. Det har vært en stor utfordring. Dersom vi ser utviklingsskisse, kommuneplanens arealdel og områderegulering som en helhetlig prosess, startet den i 2008 og er fortsatt ikke avsluttet. På grunn av dette har vi dessverre underveis mistet noen interessante ideer, både innen nærings- og boligformål. Fra småsamfunnsprosjektets side, ansees områdereguleringen som både nyttig og nødvendig, med tanke på langsiktig utvikling for Bjonerøa.

4.2 Boligstruktur

Denne arbeidsgruppa har vært opptatt av hvordan man best kan legge til rette for at folk skal kunne bosette seg i Bjonerøa. Tiltaksområdet går direkte på hovedmålsetningen i småsamfunnsprosjektet, men er samtidig det området det har vist seg vanskeligst å jobbe fram konkrete resultater i.

Gjennom bjonerøa.no har tomter og brukte boliger blitt profilert. Se vedlegg 1, lenke 4. I tillegg har man gått ut med en generell oppfordring om at alle som har, eller vet om, boliger for salg eller utleie melder dette til prosjektet. Det er også gjort forsøk på dialog med enkelte eiere av ubebodde eiendommer, men her har det vært viktig å gå varsomt fram.



Bjonerøa ønsker seg flere innbyggere, gjerne noen som vil bygge hus.

Gjennom bjonerøa.no kommer det enkelte henvendelser fra folk som ønsker å flytte til Bjonerøa, og som lurer på hvilke muligheter som finnes. Da er det synd å ikke ha en egnet bolig å tilby. Det er ikke et stort eiendomsmarked i Bjonerøa. Både tilbud og etterspørsel varierer stort, og er sjelden avpasset i forhold til hverandre. Noen ganger er det etterspørsel uten tilbud og andre ganger omvendt. Vi ser også at det lille boligmarkedet som er i Bjonerøa preges av at flere eiendommer kjøpes som fritidsboliger. Mange av de mest attraktive boligene, som er solgt de siste årene, har blitt feriehus. Behovet for å motvirke denne utviklingen har vært diskutert, og vil fortsatt være et tema.

Ledige tomter i Bjonerøa har også blitt markedsført gjennom Hadelandregionens satsning ledigtomt.no. Se vedlegg 1, lenke 5.


Andre faktorer, som for eksempel tilgang til barnehageplass, har også spilt inn for folk som har vurdert å flytte til Bjonerøa. Her har situasjonen variert fra år til år. Prosjektleder har på vegne av arbeidsgruppa argumentert overfor kommunens politikere for at barnehage tilbudet i Bjonerøa må ha en fleksibilitet, slik at det er mulig for innflyttere å få barnehageplass raskt. Vi vet at vi har mistet mulige innflyttere på grunn av manglende barnehageplass. Denne problemstillingen henger derfor nøye sammen med ønsket om å skape tilflytting.

Arbeidsgruppa har også erfart at det er et visst behov for utleieboliger. I den forbindelse er det gjort enkle sonderinger i forhold til etablering av et investeringsselskap og få utbyggere til å satse på et mindre boligprosjekt i Bjonerøa. Det kunne vært interessant å se om det gikk an å skape mer dynamikk i boligmarkedet ved å tilby leiligheter til unge i etableringsfasen eller seniorer som vil ha noe annet enn enebolig.

Alle de ovennevnte faktorene henger også nøye sammen med arbeidet med utviklingsskisse, arealplan og områderegulering. Det har vært prioritert å jobbe for avsetning av nye arealer til boligbygging, som et alternativ til regulerte tomter på det kommunale boligfeltet Haug. En grunneier tok selv initiativ til avsetning av eiendom til boligformål. Andre grunneiere har blitt forespurrt om de er interessert i å bruke deler av sine eiendommer til slikt formål. Endelig utfall vil bli klart gjennom områdereguleringen. Det er viktig at det fra lokalsamfunnets side blir lagt mest mulig til rette for boligbygging, så har man i hvert fall noe å tilby til de som vil bosette seg i Bjonerøa.

4.3 Stedsutvikling

Allerede da småsamfunnsprosjektet ble startet, hadde Forum Bjonerøa jobbet fram planer om en badeplass/friområde der Bjonelva munner ut i Randsfjorden. Bakgrunnen var at grunneier tilbøy bruk av arealet som fra gammelt av hadde vært en mye brukt badeplass.

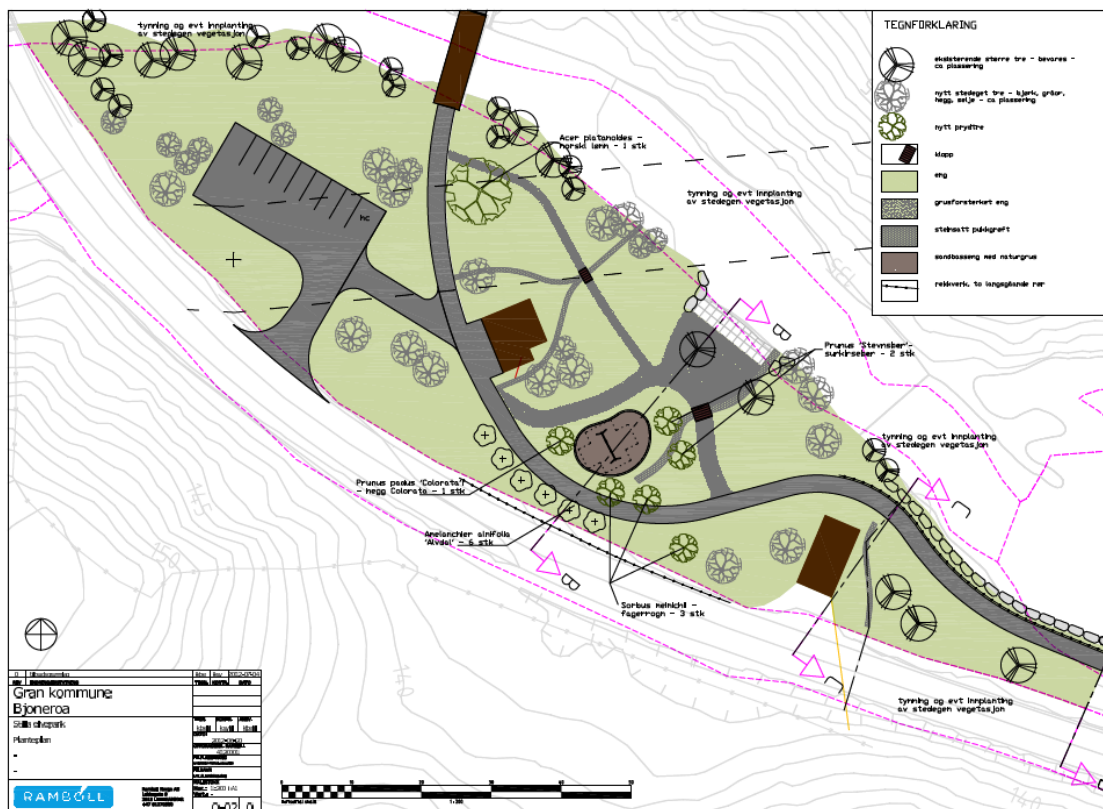

Illustrasjonsskisse,
Stilla Elvepark

I sammenheng med dette tiltaket, begynte man også å utvikle ideen om en tursti/strandpromenade på strekningen fra Skolevegen-Ådalsvegen.



Illustrasjonsskisse, tursti langs fv245, mellom Skolevegen og Ådalsvegen, via Stilla Elvepark.

Det først som lot seg gjennomføre, var bygging av bru i Stilla Elvepark. Det begynte med at Forum Bjonerøa tilfeldigvis fikk kjøpt en brukt bru, som tidligere hadde vært plassert mellom Tjuvholmen og Aker Brygge i Oslo. Sommeren 2009 ble den fraktet fra lagerplass på Jaren via Randsfjordferga til Bjonerøa. Brua ble tilpasset og delvis ombygd, før den ble plassert på gamle brukar der hovedvegen gjennom Bjonerøa tidligere har gått.



Brua i Stilla Elvepark underveis i prosessen: gamle brukar, frakting og bygging av brua.

Prosjektering av tiltakene har vært omfattende og tidkrevende. Underveis har vi vært nødt til å splitte arbeidet opp i flere deler, for å få ferdigbehandlet og påbegynt de delene som har vært lettest å realisere.

Arbeidet ble delt inn i flere faser:

- Etablering av gangbru over Bjonelva (fullført 2011)
- Opparbeiding av friområde der Bjonelva munner ut i Randsfjorden, inkludert tursti gjennom elveparken (nesten fullført 2013)
- Opparbeiding av tursti gjennom tettstedet (prosjektert, byggetillatelse gitt høsten 2013)

Kort fortalt har prosjekteringsprosessen bestått av følgende steg:


- byggesak for bru over Bjonelva
- reguleringsplan for Stilla Elvepark
- avtale med grunneiere
- byggesak for Stilla Elvepark
- søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for strandsti
- byggesak for tursti/strandpromenade
- byggesak for oppføring av enkle bygg/installasjoner i Stilla Elvepark
- søknad om løyve til oppsetting av velkomstskilt og informasjonstavle

Per i dag er det gitt tillatelse til alle omsøkte tiltak. Tillatelsen til standstien forelå ikke før september 2013, og det har derfor ikke vært mulig å realisere den nå. I byggetillatelsen ligger det en del vilkår som kompliserer den siste fasen. Dette ønsker arbeidsgruppa å bruke tid på å bearbeide gjennom vinteren 2013/2014.



Oversiktsbilder fra Stilla Elvepark, tatt underveis sommeren og høsten 2013

Det er ikke til å legge skjul på at de formelle prosessene har satt troen på prosjektet på prøve. Derfor var det stor glede når dugnadsgjengen endelig kunne komme i gang med mer praktisk arbeid sommeren 2013. Opparbeidelsen av Stilla Elvepark har blitt gjort med en blanding av innleide tjenester og frivillig arbeidsinnsats. På denne måten har man fått mye for pengene. Det har vært svært gledelig å se så mange innbyggere stille opp på dugnad. Barn, unge, voksne og eldre har møtt opp når arbeidsgruppa har bedt om hjelp. Det er spesielt meningsfylt når folk i alle aldre jobber og har det trivelig i sammen.

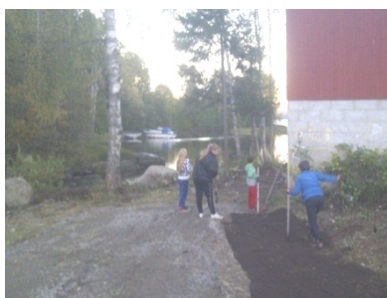

Dugnader sommeren og høsten 2013

Arbeidsoppgaver som har blitt utført eller er under ferdigstillelse i 2013:

- rydding av vegetasjon
- etablering av ny innkjøring og parkeringsplass
- opparbeiding av tursti gjennom Stilla elvepark
- planering av terreng
- drenering i lukkede og åpne grøfter
- legging av heller på plasser som skal møbleres med krakker og bord
- utlegging av matjord og såing av gress
- etablering av lekeområde med sandbasseng og lekeapparater
- oppsetting av overbygg til langbord
- oppsetting av overbygd grill
- oppsetting av informasjonstavle

Stilla Elvepark vil være klar til bruk våren 2014. Det er det mange som ser fram til. Men, det er å håpe at også den siste fasen kan bli realisert. Stedsutviklingsgruppa vil jobbe videre under Forum Bjøneroa. De vil bruke vinteren til å studere vilkårene for bygging av strandstien og gjøre klart til bygging så snart som mulig. Selv om småsamfunnsprosjektet avsluttes, ønsker man å fortsette samarbeidet om stedsutvikling med Gran kommune.



Slike krakker kommer på plass i Stilla våren 2014

Gjennom å opparbeide Stilla Elvepark og den planlagte standsstien, leggs det til rette for bading, båtliv, fiske og friluftaktiviteter ved Randsfjorden og Bjønrelva.

Dette tiltaksområdet er helt klart det som har vært mest omfattende og krevd mest ressurser, både menneskelig og økonomisk. Som en viktig del av det å gjøre Bjøneroa til et mer attraktivt sted, har småsamfunnsprosjektet handlet mye om stedsutviklingstiltak. Begrunnelsene ligger i nærheten til vassdrag og innsjø, et ønske om å binde sammen to tyngdepunkter i tettstedet, tilrettelegge for friluftsopplevelser og skape utendørs møteplasser.

Stedsutvikling er et stort og omfattende tema. Det mangler ikke på tanker og ideer. Av de tingene man ikke har hatt kapasitet til å ta tak i denne omgang nevnes:

- Åpne landskapet og rydde "grønne tunneler" på utvalgte steder i Bjøneroa
- Utarbeide turkart for veståsen og merke ruter for turgåing

4.4 Omdømme

Dette tiltaksområdet har fått mye oppmerksomhet og generert mye aktivitet, samtidig som det innholdsmessig har blitt omarbeidet underveis. Kort sagt har denne arbeidsgruppa sett det som sin fremste oppgave å drive informasjons- og profileringsarbeid som fremmer Bjøneroa som et godt sted å bo, besøke eller etablere seg.

4.4.1 Næring

Ved oppstarten av prosjektet var det nok flere som hadde forventninger til konkret arbeid med næringsutvikling og turisme. Det viste seg raskt at det var naturlig å begynne i en annen ende, med mer generelle tilretteleggingstiltak i form av informasjons- og profileringsarbeid. I tillegg ønsket arbeidsgruppa å jobbe holdningsskapende, i forhold til å bygge et godt omdømme for bygda og jobbe fram en kultur for utvikling.

Tanken var at arbeidsgruppa kunne motivere og være kontaktpunkt og støtteapparat for alle som ville etablere seg i Bjøneroa. For eksempel har småsamfunnsprosjektet, gjennom arbeidet med utviklingsskissen og områdereguleringen, forsøkt å få arealavklart et område som var

aktuelt for utvikling av turistnæring. Dessverre dro prosessen for langt ut i tid, og signalene fra overordnede myndigheter var så tydelig negative, at tiltaket ble lagt på is.

Det har vært gjort noen forsøk på å bringe sammen lokale krefter som er opptatt av næringsutvikling. Gjennom prosjektperioden er det avholdt et antall åpne møter med næringsutvikling og samarbeid som tema. Det er vanskelig å peke på konkrete resultater av dette.



Første offisielle anløp av turistbåten på Randsfjorden, ble selvsagt tatt godt imot i Bjøneroa, sommeren 2013.

Et annet tiltak som har et næringsperspektiv, er etableringen av brygge for turistbåt og småbåter på Randsfjorden. Randsfjorden grunneierforening søkte Gran kommune om støtte til sitt arbeid for å gjøre Randsfjorden mer tilgjengelig. Dette ble en sak for småsamfunnsprosjektet, og den kommunale andelen på 75.000 kr er bevilget av styringsgruppa. For øvrig er det Randsfjorden grunneierforening som er tiltakshaver og ansvarlig for samarbeid med grunneier og bryggeeier. Dette tiltaket ansees som viktig for å sikre at Bjøneroa kommer med i betraktningen når man jobber for å skape mer liv og røre ved og på Randsfjorden.

4.4.2 Profilering

Det har vært jobbet med omdømmebygging hele veien, både eksternt og internt. Ekstern omdømmebygging har hatt som formål å profilere bygda Bjøneroa, skape oppmerksomhet og gi et positivt inntrykk av lokalsamfunnet vårt. Internt har man jobbet med holdninger og handlinger som kan virke positivt for alle som bor og besøker bygda. Motivasjon for frivillighet og engasjement for lokalsamfunnet har vært et viktig moment her.

Det har også vært en viktig oppgave for denne gruppa å jobbe med å synliggjøre Bjøneroa. Et eksempel har vært deltakelse på Hadelandsmessa med egen stand om Bjøneroa.

I starten av prosjektet var arbeidsgruppa opptatt av å få på plass velkomstskilt langs hovedvegene i Bjøneroa. Samtidig hadde regionrådet for Hadeland et tilsvarende skiltprosjekt på gang. Da dette ble realisert, var det ikke naturlig å gå videre med Bjøneroas planer, da man følte at det ble for mye skilting på et lite sted.

Forslag til skiltplan med informasjons- og vegvisingsskilter ble oversendt Statens vegvesen i 2009. Vi ser at dette kanskje var i tidligste laget, da en del ting har blitt avklart i etterkant. Skiltplanen må oppdateres i forhold til endringer gjennom prosjektets gang. Det mest sentrale elementet i skiltplanen er behovet for en informasjonstavle. Etter vurdering av mange alternativer, falt man på en løsning med en stor informasjonstavle i Stilla Elvepark. Denne er nå på plass. Det vil være naturlig om Forum Bjøneroa følger opp skiltplanen i samarbeid med Gran kommune.

Vi fikk tilbud fra Distriktssenteret om å være vertskap for omdømmeskolen, et motiverings- og opplæringsopplegg for kommuner og lokalsamfunn. I den forbindelsen arrangerte vi seminar på Bergslia i Brandbu. I denne forbindelsen fikk Distriktssenterets representanter også anledning til å bli bedre kjent med småsamfunnsprosjektet i Bjøneroa.

4.4.3 Oppmuntringssaken

26. juni 2010 ble Bjonerøa verdens første oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn.

Underveis i småsamfunnsprosjektet ble det behov for å revitalisere prosesser, som mistet sin intensitet, og motivere de frivillige til fortsatt innsats. Dermed ble det våren 2009 invitert til «Bygdelivsverksted» med Tom Åge Myhren. Han har bakgrunn fra suksesshistorien om Lucky Næroset og var den første som introduserte oppmuntringssaken for Bjonerøa. Dermed var også kontakten med den initiativbaserte alliansen LivsVerkene etablert.

I etterkant av det nevnte seminaret, fikk Bjonerøa tilbud om å bli pilot for en oppmuntringssertifisering. Dette gikk i korthet ut på å bli ledet igjennom en prosess over mer enn et halvt år, med opplæring og utvikling av oppmuntringssaken i Bjonerøa. Dette var et veivalg som det var viktig å forankre både i prosjektet og lokalsamfunnet. Forankringen hos prosjekteier ble ivaretatt ved at humørbonde Geir Styve holdt et inspirerende foredrag om oppmuntring under en orientering i kommunestyret høsten 2009. I tillegg ble hele bygda invitert til oppmuntringskveld i september 2009. Etter å ha fått saken presentert av livsgnistrer Tom Åge Myhren og humørbonde Geir Styve, ble forsamlingen bedt om å ta stilling til om Bjonerøa skulle begi seg ut på dette. Responsen var overveldende positiv og dermed var prosessen i gang. Det ble snart formulert et konkret mål om å gjøre Bjonerøa til verdens første oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn og bruke denne statusen i omdømmearbeid.

Den viktigste grunnen til å jobbe med oppmuntring, har hele tiden vært et ønske om å spre gode holdninger og positive handlinger. Gjennom denne piloten var det en del krav som måtte oppfylles for å bli sertifisert:

- Oppmuntringsagenter

I november 2009 ble 12 personer, 9 hjemhørende i Bjonerøa, utdannet til oppmuntringsagenter. Disse agentenes oppgave har vært å fremme oppmuntringssaken, samt å hjelpe Bjonerøa til å oppfylle alle kravene til sertifisering innen sommeren 2010.



26. juni 2010 ble Bjonerøa oppmuntringssertifisert.

- Oppmuntringsplaner på to nivåer

Ny prosjektplan for fase 2 av småsamfunnsprosjektet ble vedtatt av kommunestyret i april 2010. Her var oppmuntringssaken tydelig synliggjort som et virkemiddel i omdømmearbeidet. Et antall oppmuntringsplaner ble satt i gang av oppmuntringsagentene.

- Oppmuntringstilsyn

Forum Bjonerøa ble utnevnt til lokalt oppmuntringstilsyn. Styret har hatt en pådriverrolle i alle utviklingsprosesser. Oppmuntringstilsynet rolle er å sikre at oppmuntringsplaner har blitt fulgt, fornyet og etterfulgt av flere tiltak.

- Livskraftutveksling

For å binde lokale drivkrefter sterkere sammen, knytte kontakter med andre miljøer, utveksle erfaringer og dele ideer, inviterte Bjonerøa til kraftutveksling siste helga i juni 2010.

- Reservasjonsregister

Ingen kan tvinges til å gi eller ta imot oppmuntring. Derfor har alle innbyggere blitt gitt muligheten til å reservere seg mot oppmuntring ved å levere inn kupong i reservasjonsregisteret. Lokalt oppmuntringstilsyn har ikke mottatt noen reservasjoner.

- Gjennomføringsevne

I slike prosesser kan det være en fare for at ord ikke blir til handling. Det er lett å jobbe fram ideer, men ikke like lett å gjennomføre dem i praksis. Et viktig krav for å kunne bli sertifisert, har derfor vært å vise gjennomføringsevne over tid.

Oppmuntringsagentene har vært bærebjelken i arbeidet med oppmuntringssaken. De har som gruppe, alene eller i samarbeid med andre grupper, sørget for utvikling og gjennomføring av en rekke tiltak som har utviklet Bjonerøas omdømme i en svært positiv retning. Oppmuntring er initiativbasert. Agenter bruker oppmuntringsplaner som verktøy. Dette er enkle skjemaer som beskriver hva man vil oppmuntre til og hvordan oppmuntringa skal foregå. Her følger en oversikt over oppmuntringsplaner som er gjennomført, i sertifiseringsperioden og senere:

- Oppmuntringskort og –bevis: Bruk av skriftlige oppmuntringsmeldinger
- Smilepostkasser: Synliggjøring av oppmuntringssaken ved at «alle» i bygda har dekorert postkassene sine med smilefjes.
- Snorklipper: Rekruttering av person(er) som kan gi en hjelpende hånd ved seremonier av ulike slag.



BrubyggerBygda Bjonerøa er i positiv utvikling, og har nådd en viktig millimeterpæl. I forbindelse med arbeidet for å bli verdens første oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn, har vi klart så skape en arbeidsplass.

SNORKLIPPER SØKES

Er du glad i folkemengder? Liker du oppmerksomhet? Er du genuint interessert i mennesker? Da er dette jobben for deg. På grunn av forventet økende arbeidsmengde trenger vi en fleksibel, løsningsorientert, proaktiv person med «stå-opp-vilje» og glimt i øyet. Søker trenger fast grep om det meste, fortrinnsvis saks. Det er viktig å kunne kombinere kutting og knytting av bånd. Jobben vil innebære en del kvelds- og helgeoppdrag. Det er en fordel med egen bil - og førerkort. Vi tilbyr noe opplæring, vilkårlig belønning og variert miljø.

Utenbygdsboende oppfordres til å søke, men alle søknader vil bli vurdert. Spørsmål rettes til Dagli Gleder og Oppmuntringsagent Olga Elisabeth Tokerud, tlf. 916 95 436. Søknad med CV og vedlegg sendes til snorklipper@bjonerøa.no innen 20. april.

- 17. mai 2010 - tale for dagen: Spredning av oppmuntringsbudskapet på en viktig høytidsdag med mange mennesker samlet i Bjonerøa.
- "From Bjonerøa with love": Innsamling av anonyme oppmuntringer fra folk i Bjonerøa. Spre glede, dele ut klemmer og oppmuntringsmeldinger fra Bjonerøa til andre deler av samfunnet. Eksempel: Overraskelsesbesøk i kommunestyret høsten 2010.
- BrubyggerBygda Bjonerøa: Ordspill, begreper, nye påfunn i brubygger-ånd. Bygge visjon og verdier rundt dette.
- ammaTØRfestival sommeren 2010: Arrangement bare for moro skyld. Fokus på å tørre! Sosialt og identitetsbyggende.
- En annerledes bygdekveld: Motarbeider Halvor Haukerud hjalp oss å dra ned stemningen etter en lang og vanskelig opptur.
- Norsk stamsnelleinstitutt: Stamsnella for oppmuntring har sin genesis i oppmuntringssertifiseringen av Bjonerøa. Snelledeling med andre sertifiserte er en viktig del av oppmuntringssaken nasjonalt. Sikker oppbevaring og forvaltning av Stamsnella. Egne statutter for stamsnelleinstituttet.
- Jubeldag i juni 2011: Arrangement med fokus på saker å feire. Hemmelig gjest, tre snorklippinger og mye moro
- Oppmuntring av eldrerådet: Oppmuntringsagenter fra Bjonerøa var underholdningsinnslag under kommunal markering av den internasjonale eldredagen.
- Bløtkakefest: Bygdekveld med fokus på kulturbygget, høsten 2011. Feiring av 910.000 kr til rehabilitering av scene m.m.
- Det klikker for Bjonerøa: Gedigen mobilisering for at Bjonerøa skulle vinne TV2 nettavstemning om sted i Oppland som fikk reportasje i «God Morgen Norge»
- «Liv Laga» - fotoutstilling med bygdeliv og bygdefolk fikk sin permanente plassering i Bjonerøa Kulturbygg, etter tre år som sommerattraksjon.
- Skipper surprise: Kaffeslaberas med Randsfjordfergas «grand old man», siste arbeidsdag før pensjonisttilværelsen.
- «Sånn var'e»: Fotoutstilling med historiske bilder fra hele bygda. Sommerutstilling/turistattraksjon.
- Ferjeinspeksjon: Avdekking av humøravvik hos Bjonerøas befolkning i forbindelse med en måneds driftsavbrudd på Randsfjordsferja, sommeren 2012.

Denne stillingsannonsten ble rykket inn i lokalavisa, våren 2010.



ammaTØRfestival, august 2010



Jubeldag, juni 2011



Åpning av fotoutstillingen «Liv Laga», juni 2009

Proessen og de enkelte hendelsene er fylldig dokumentert på bjonerøa.no. Se vedlegg 1, lenke 6. Underveis har gruppa med oppmuntringsagenter endret sammensetning. Noen har falt i fra, mens andre har kommet til. Det er en naturlig utvikling. Mot slutten av prosjektperioden er intensiteten i oppmuntringssaken betydelig mindre, og det kan hende Forum Bjonerøa må gjøre noen grep for å vitalisere dette igjen.

Bygdas omdømme må jobbes med kontinuerlig. Det er viktig å holde fast på verdiene som ligger til grunn, samtidig som det vil være viktig å fornye og vitalisere omdømmearbeidet. Det som er gjort gjennom Småsamfunnsprosjektet må vedlikeholdes i årene som kommer. Utfordringen er å bygge et omdømme som alle kjenner seg igjen i. Det handler om hvilke historier innbyggere og tilreisende forteller om Bjonerøa. De siste årene har i hvert fall alle fått mer å snakke om.

4.5 Samferdsel

Denne arbeidsgruppa er opptatt av veger, ferje og muligheten for bru over Randsfjorden. Sistnevnte sak har krevd masse ressurser og tatt det meste av oppmerksomheten, ved siden av oppfølging av ferjetilbudet.

I forbindelse med overgangen til fase 2 i småsamfunnsprosjektet, ble det besluttet at det var mest ryddig om denne arbeidsgruppa rapporterte til styret i Forum Bjonerøa. Småsamfunnsprosjektet har støttet arbeidet i gruppa økonomisk.

- Sikre en forsvarlig drift/bemannning og få staten til å ta økonomisk ansvar for Randfjordferja
- Dokumentere fakta om bruk av ferja og utrede behov for endringer av rutetilbudet. Øke oppmerksomheten rundt ferja og bruke den i profilering av bygda.
- Jobbe for utbedring av Rv245, særlig de mest kritiske stedene. Jobbe for at hele strekningen får full vegbredde og at det bygges gang- og sykkelvei i Bjonerøa.
- Tilstrebe forbedring av vegstandarden og vintervedlikeholdet på alle lokale riks- og fylkesveger
- Utrede bruforbindelse over Randsfjorden



Randsfjorden, som historisk var en viktig ferdsselsåre, er i dagens transportbilde en barriere.

Samferdselgruppa har jobbet mest med oppfølging av Randsjordferga og muligheten for bru over fjorden. Dette arbeidet har vært såpass krevende at arbeidsgruppa ikke har hatt kapasitet til å fokusere særlig på forhold knyttet til øvrig vegnett i området.

Arbeidsgruppa har jevnlig vært i dialog med Gran kommune (til og med 2009) og Oppland fylkeskommune (fra og med 2010) vedrørende fergedriften. I forbindelse med forvaltningsreformen og overføring av ansvaret for ferga til Oppland fylkeskommune, har arbeidsgruppa fremmet synspunkter fra et brukerperspektiv. Dette har blant annet dreid seg om bekymringer rundt knapp bemanning, forslag til endring av rutetider, behov for informasjon, behov for et stabilt tilbud osv. Arbeidsgruppa har også vært en målbærer for mange brukeres frustrasjon over flere langvarige driftsavbrudd.

De siste årenes problemer rundt fergedriften har aktualisert ønsket om bru til erstatning for ferga. Arbeidsgruppa har tatt initiativ til å bringe denne saken et skritt videre, ved å utarbeide en mulighetsanalyse for bru over Randsfjorden. Gran kommune har bevilget 100.000 kr til

dette arbeidet gjennom budsjettet for 2010. Småsamfunnsprosjektet har bidratt med 31.500 kr til det samme formålet.

Mulighetsanalysen ble presentert av arbeidsgruppa i et åpent møte 6. januar 2013. Forum Bjøneroa overleverte sin rapport til ordføreren i Gran kommune, med oppfordring om å ta saken videre politisk. Gjennom 2013 har mulighetsanalysen blitt presentert i regionrådet for Hadeland og for samferdselskomiteen i Oppland fylkeskommune. Mer informasjon om mulighetsanalysen finnes i vedlegg 1, lenke 7-8.



I januar 2013 fikk en fullsatt gymsal i Bjøneroa Kulturbygg presentert mulighetsanalyse for bru over Randsfjorden. Ordføreren i Gran kommune fikk rapporten overlevert.

4.6 Bredbånd

Ved starten av småsamfunnsprosjektet var bredbånd fortsatt en svært viktig sak for Bjøneroa. Forum Bjøneroa hadde gjennom sitt arbeid fått påvirket HRB til å etablere en løsning med ADSL2+ for mange abonnenter knyttet til telefonsentralen i Bjøneroa. Denne løsningen var ikke fullgod, og arbeidsgruppa så på muligheter for å få til dekning for andre områder i Bjøneroa.

Hadelandskommunenenes felles satsning på utbygging av trådløs teknologi, bidro etter hvert til at alle som ønsket det, fikk et tilbud. Fra småsamfunnsprosjektets side, så man derfor ikke behov for å jobbe videre med bredbånd som eget fokusområde. Ved overgangen til fase 2 ble derfor arbeidsgruppa nedlagt.

4.7 Helse og beredskap

Dette tiltaksområdet har betydning for Bjøneroa som et attraktivt sted å bo. Arbeidsgruppa har gjort en del undersøkelser og sonderinger, særlig rundt eksisterende helsetilbud. De har også jobbet for at folk i Bjøneroa skal få bedre informasjon om det helsetilbudet og den beredskapen som finnes.

Under dette arbeidsområdet har det også vært jobbet, fra småsamfunnsprosjektets side, med bedre tilrettelegging for fastlegen i Bjøneroa. Det hadde lenge vært signalisert at fastlegen som har utekontor i Bjøneroa Kulturbygg, hadde behov for utbedring av sine lokaler. Av hensyn til pasientene, var det ønske om en egen ambulanseinnngang. I tillegg var det nødvendig å skaffe mer plass for legesekretær og laboratorium. Dette var en sak som verserte mellom ulike virksomheter i lengre tid, uten å bli avklart. Saken ble tatt opp gjennom småsamfunnsprosjektet, og fant etter hvert sin løsning. Høsten 2012 ble dette tiltaket fullført av Bjøneroa Kulturbygg AS, finansiert av Gran kommune.

Hovedinntrykket er at folk i Bjøneroa i det store og hele er fornøyd med de primærtjenestene som finnes i bygda. Fokus framover vil være å opprettholde tilbudet til innbyggerne – både helsesøster, legekontor, eldrester med hjemmebasert omsorgstilbud og frivillig brannvesen er viktige for innbyggernes trygghet og trivsel.

4.8 Kultur og trivsel

Bjøneroa har flere gode fritidstilbud for store og små, i regi av lokale lag og foreninger. Gjennom småsamfunnsprosjektet har man jobbet for å styrke og supplere det som finnes. Fokus har først og fremst vært å prøve ut aktiviteter og legge forholdene til rette med bedre lokaler og mer utstyr. Fra starten av prosjektet ble det jobbet med å sette i gang aktiviteter som folk meldte interesse for. Ulike kulturgrupper ble organisert av ressurspersoner innenfor ulike interesseområder. Vi kan blant annet nevne flere ulike dansekurs og workshops som ble holdt i begynnelsen av prosjektperioden.

Det viktigste enkeltstående tiltaket var etablering av et nytt ungdomslokale i Bjøneroa Kulturbygg. Gjennom samarbeid med lokale foreninger, fikk man disponere arealer i kulturbygget som TT-klubb, ungdomsklubb, band og kulturgrupper kunne bruke til sine aktiviteter. Et spleiselag med mange bidragsytere sørget for penger til innkjøp av møbler og utstyr. I tillegg til småsamfunnsprosjektet, finner vi disse bidragsyterne: Bjøneroa Sanitetsforening, Bjøneroa Idrettslag, Bjøneroa Ungdomsklubb, TT-klubben (FAU) ved Bjøneroa skole og Frifond barn og unge. Disse har bidratt med til sammen 50.000 kr i tillegg til det småsamfunnsprosjektet brukt.

Det ble også gjennomført en forsøksperiode med fast fritidsleder på TT-klubb og ungdomsklubb. Man antok at dette ville gi et mer helhetlig og stabilt tilbud, enn den praksisen som har vært i alle år; foreldre som bytter på å være vakter. Forsøksperioden var vellykket og ordningen er forsøkt videreført. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å få noen til å ta jobben. Klubbene fortsetter derfor som før, med foreldrene på vaktlistene. Det skal sies at kulturkontoret for Gran og Lunner har vist vilje til å finansiere noe i forhold til fritidsleder.

I løpet av prosjektperioden har det blitt gjennomført et åpent møte med tema «Ung kultur». Her møttes ungdommer, foreldre, Forum Bjøneroa, medarbeidere fra kulturkontorer og noen lokalpolitikere opp. Her ble flere forhold rundt ungdommer fra Bjøneroa drøftet. Det viktigste var behovet for en fast fritidsleder. I tillegg ble det tatt opp behov for et desentralisert tilbud innen kulturskolen. Fra Bjøneroas side har man bedt om workshops med instrumentopplæring og lignende. Som et svar på dette, arrangerte kulturskolen rockeskole med Adam Douglas. Dette var svært vellykket. Den største utfordringen for å få til et godt fritidstilbud for barn og unge i Bjøneroa, er tilgangen på voksenpersoner som kan jobbe med ungdommene våre over tid.

Småsamfunnsprosjektet har også bidratt med et beløp til spleiselaget for ny scene med utstyr i Bjøneroa Kulturbygg. Dette var en gladsak hvor mange lokale virksomheter bidro med til sammen 420.000 kr. Ved siden av Forum Bjøneroa og småsamfunnsprosjektet, bidro Bjøneroa Sanitetsforening, Bjøneroa Idrettslag, Bjøneroa Musikkorps, Bjøneroa Velforening og Veståsen Jeger og Fiskerforening. I tillegg kom gaven fra Sparebankstiftelsen Gran på 500.000 kr. Dette var akkurat nok til å finansiere tiltaket, og høsten 2012 kunne Bjøneroa feire at man var i mål.



Ungdomslokalet i Bjøneroa kulturbygg



Åpning av ny scene, november 2012 – lokale utøvere bidro til en fin kulturkveld



5 Økonomi

5.1 Budsjett og forbruk

En samlet oversikt over økonomien i småsamfunnsprosjektet følger av tabellen nedenfor:

Budsjett og regnskap per 31.12.2013	Regnskap	Budsjett
	2007-2013	2007-2013
Personalkostnad	1 140 993	1 160 000
Felleskostnader, adm, kontorhold m.m.	129 695	140 000
Bevilgninger til tiltak	1 599 406	1 200 000
Stedsutvikling, Statens Vegvesen		1 000 000
Sum	2 870 094	3 500 000
Gjenstående	629 906	

Nedenfor følger en litt mer detaljert framstilling av de samme tallene:

Spesifikasjon av regnskap 2007-2013	Regnskap	Gruppert
Lønn, pensj., fors., arb.g.avg. - prosjektleder	1 132 323	1 140 993
Møtegodtgjørelse	8 670	
IT-kostnader	48 617	129 695
Bevertning	26 142	
Kontorhold m.m.	30 306	
Kompetanseheving og erfaringsspredning m.m.	6 077	
Reisekostnad	18 553	
Stedsutviklingsskisse - kommuneplanens arealdel - områderegulering	133 563	133 563
Reguleringsplan Stilla Elvepark	25 503	1 113 003
Byggesak bru Stilla Elvepark	54 275	
Bygningsmessig bru Stilla Elvepark	65 931	
Terreng/friområde/tursti i Stilla Elvepark	365 380	
Opparbeiding av tursti langs Randsfjorden	-	
Fortausløsning nord for renseanlegg	-	
Oppmåling m.m. manglende kartgrunnlag	48 776	
Prosjektering Stilla	136 591	
Prosjektering tursti	151 448	
Utstyr og møbler stedsutviklingstiltak	265 100	
Brygge (Randsfjorden grunneierforeing)	75 000	352 840
Felles arrangementer - motivasjon/inspirasjon	59 504	
Oppmuntringssaken, omdømmebygging, profilering	78 471	
Bredbånd	4 300	
Kultur og fritid	104 065	
Samferdsel	31 500	
Sum	2 870 094	2 870 094

Intensjonen med småsamfunnsprosjektet har hele tiden vært at mest mulig av midlene skulle brukes til konkrete tiltak, framfor lønn og administrasjon. Frivillighet har vært grunnlag for aktiviteten, men det har også vært helt avgjørende å ha noen ansatt for å skape nødvendig framdrift. Bemanningsrammen for prosjektlederstillingen har vært inntil 50% stilling gjennom hele prosjektperioden, men man har valgt å holde seg til 20-35%.

5.2 Finansiering

Den økonomiske rammen for småsamfunnsprosjektet har vært 1.300.000 kr fra Gran kommune og 1.200.000 kr fra Oppland fylkeskommune. I tillegg kommer 1.000.000 kr til stedsutvikling fra Statens vegvesen. Disse midlene har blitt brukt til ulike tiltak for å nå målene i prosjektet. I tillegg har man gjennom Forum Bjønøroa søkt andre finansieringskilder. Kapitaltilførsel fra ulike private og offentlige virksomheter i forbindelse med enkelttiltak utgjør til sammen et betydelig økonomisk bidrag.

Den frivillige innsatsen er vanskelig å tallfeste nøyaktig. Men, i forsøk på å synliggjøre verdien, kan vi gjøre et overslag. I løpet av prosjektperioden har det blitt lagt ned anslagsvis 5000 arbeidstimer i arbeidsgrupper og øvrig prosjektorganisasjon, både gjennom møter, forberedelser, gjennomføring og etterarbeid knyttet til de ulike tiltakene. Med en kalkulert timepris for dugnad på 200 kr, beløper arbeidsinnsatsen seg til minst 1.000.000 kr. I tillegg kommer dugnader knyttet til stedsutvikling. Etter en oppsummering av innsatsen høsten 2013 er denne anslått til ca 120.000 kr.

Det er derfor naturlig å sette opp en samlet oppstilling for å synliggjøre hvordan kommunale prosjektmidler har blitt mangedoblet gjennom bidrag fra mange ulike kilder.

Økonomiske bidrag til småsamfunnsprosjektet og/eller enkelttiltak	Beløp
Gran kommune 2007-2013 (prosjektmidler)	1 300 000
Oppland fylkeskommune 2008-2013 (prosjektmidler)	1 200 000
Statens vegvesen 2010-2011 (stedsutvikling)	1 000 000
Forum Bjønøroa 2007-2013 (stedsutvikling 602.000 + ungdom/kultur 50.000)*	652 000
Totalsum, økonomiske bidrag	4 152 000
Dugnadsinnsats arbeidsgrupper 2008-2013, anslått verdi av 5.000 timer	1 000 000
Dugnadsinnsats stedsutvikling 2008-2013, anslått verdi	120 000
Sum, dugnadsinnsats	1 120 000

*Spesifikasjon av Forum Bjønøroas andel	
SpareBank 1 Gran 2007, stedsutvikling + ungdomsarbeid	50 000
Gjensidigestiftelsen 2009, stedsutvikling	80 000
SMIL-midler 2010, stedsutvikling	21 000
Gave Bjønøroa Arbeiderlag, stedsutvikling	11 000
Gjensidigestiftelsen 2012, stedsutvikling	450 000
Spleiselag ung kultur 2008, (TT-klubb, ungdomsklubb, idrettslag, sanitetsforening)	20 000
Frifond barn og unge, 2009	20 000
Sum, økonomiske bidrag	652 000

Denne oversikten viser at det totale økonomiske bidraget er mer enn 3 ganger beløpet fra Gran kommune. Tar vi med dugnadsinnsatsen ser vi at vi kan gange den kommunale andelen med 4. Gjennom å satse på småsamfunnsprosjektet i Bjønøroa, har Gran kommune stimulert flere virksomheter til å bidra økonomisk.

5.3 Gjenstående midler

Samlet forbruk ved avslutning av prosjektet er 2.870.094 kr. Det gir en sum gjenstående på 629.906 kr. Vi kan dermed si at prosjektet har brukt opp sin ramme, men at noen av midlene fra Statens Vegvesen står igjen.

I forbindelse med stedsutviklingstiltak er det gjort bestillinger som ikke levert ennå. Et overslag viser at dette beløper seg til ca 130.000 kr. Den reelle summen gjenstående er derfor ca 499.906 kr. Dette beløpet er det som er igjen av bevilgningen til stedsutvikling fra Statens Vegvesen, og forutsettes brukt i løpet av 2014.

Ved siden av regnskapet i småsamfunnsprosjektet, bidrar Forum Bjøneroa med egenfinansiering av stedsutviklingstiltakene i form av innsamlede midler, på nåværende tidspunkt er denne rammen på 602.000 kr, hvorav 89.551 kr er brukt. Resterende sum, 512.449 kr, forutsettes bruk på tursti/strandpromenade i løpet av 2014.

Det vil si at man samlet sett har ca 499.906 kr + 512.449 kr = ca 1.012.355 kr igjen å bruke på stedsutvikling i 2014.

5.4 Økonomistyring

Det har vært lagt vekt på tett oppfølging av budsjett og regnskap i prosjektet. Ved siden av kommunens regnskapssystem og årlige rapporter, har prosjektleder ført en økonomisk oversikt for hele perioden samlet. Det er samsvar mellom kommunens årlige regnskapsrapporter og totalregnskapet for prosjektet, noe oversikten under viser.

Kontroll mot regnskapsrapporter	Netto forbruk	Til/fra disposisjonsfond	Budsjett-ramme
Regnskapsrapport 2007	21 723	78 277	100 000
Regnskapsrapport 2008	196 094	3 948	200 041
Regnskapsrapport 2009	181 166	18 834	200 000
Regnskapsrapport 2010	55 360	144 640	200 000
Regnskapsrapport 2011	(557 145)	764 145	207 000
Regnskapsrapport 2012	203 000	-	203 000
Regnskap 2013, ikke saldert/avsluttet	869 896	(669 896)	200 000
Sum netto 2007-2013	970 094	339 947	1 310 041
Overføringer fra OFK og SVV	1 900 000		
Sum brutto forbruk 2007-2013	2 870 094		
Ramme inkludert overf. fra OFK og SVV	3 500 000		
Gjenstående	629 906		
Budsjettdifferanser	10 041		
Til disposisjon iflg. regnskapsrapporter	639 947		
Utestående OFK	300 000		
Til/fra disposisjonsfond	339 947		

Underveis i prosjektet har styringsgruppa fått regelmessige oppdateringer om økonomisk status. Styringsgruppa har godkjent alle økonomiske disposisjoner av betydning. Andre deler av prosjektorganisasjonen, som kommunestyret, referansegruppa, arbeidsgrupper og Forum Bjøneroa, har blitt orientert underveis.



I alle deler av prosjektorganisasjonen har det vært uttrykt tilfredshet i forhold til den økonomiske forvaltningen, både når det gjelder økonomistyring, disponering av midler og utnyttelse av ressurser.

6 Resultater og vurderinger

Når resultatet av småsamfunnsprosjektet skal måles, er det viktig å være klar over at det er for tidlig å vurdere de langsiktige virkningene. Vurderingene vil derfor først og fremst gå på gjennomføring av tiltakene i småsamfunnsprosjektet.


6.1 Måloppnåelse

Hovedmålet har vært å ta bruk bygdas potensial og skape positiv befolkningsutvikling. Om vi ser på befolkningsstatistikker for de siste 5-6 årene, kan vi ikke se noen positiv endring. Men, det er vanskelig å tolke små endringer i et begrenset datagrunnlag. Det er for tidlig å danne seg et relevant bilde. Kanskje ser vi ikke virkningene før det har gått noen år til? Kanskje har vi bare demmet opp for noe som ellers ville vært en mye større befolkningsnedgang? Det er vanskelig å si noe entydig om dette. Sannheten er uansett at befolkningstallene ikke peker oppover, og at det vil være et fortsatt behov for å jobbe med dette.

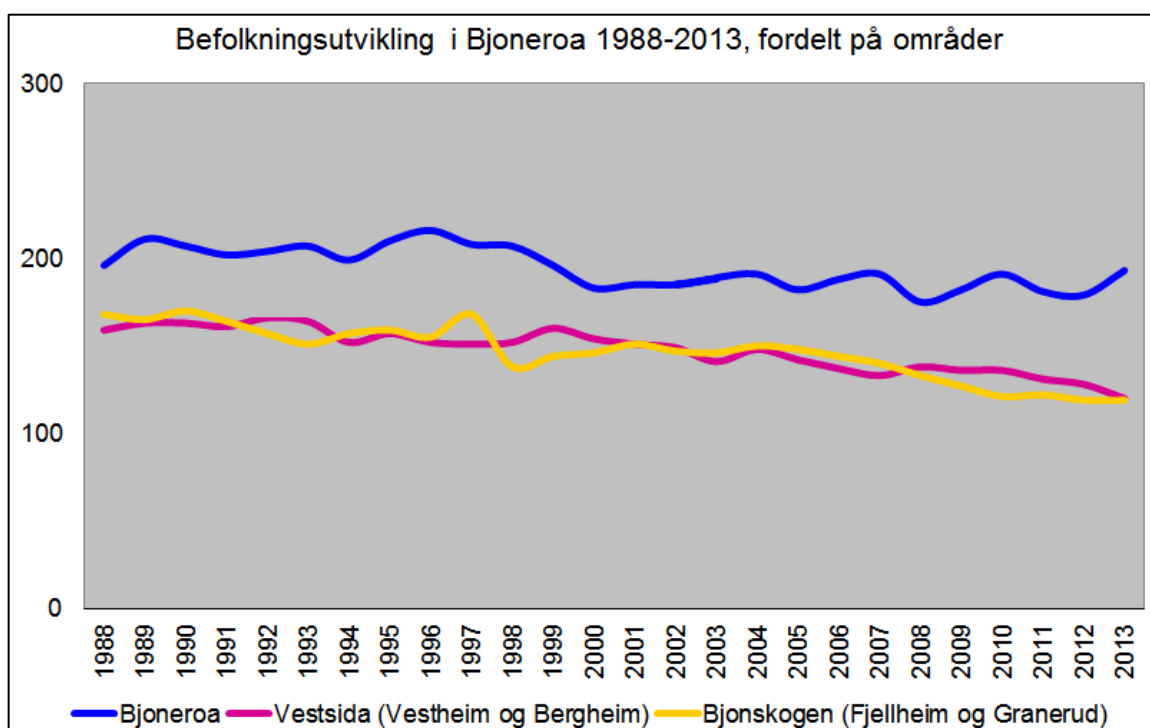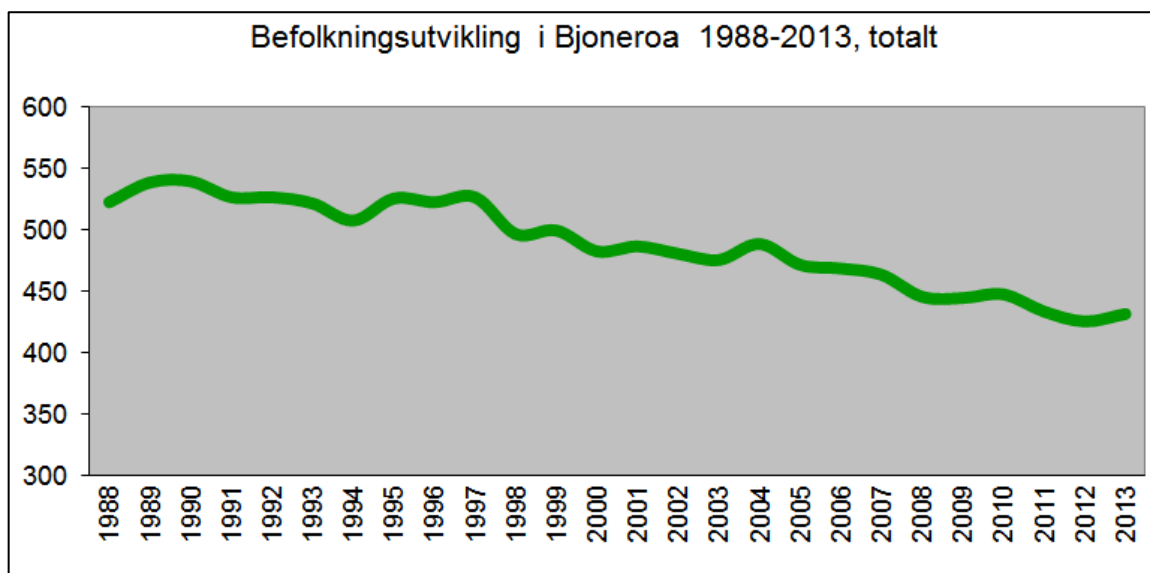

Et annet interessant moment i forhold til befolkningsstatistikk, er å se på bevegelse i ulike deler av Bjøneroa. Det finnes data fordelt på de gamle skolekretsene over en 25-årsperiode (Statistisk Sentralbyrå, statistikkbanken). Om vi grupperer disse dataene på tre områder i bygda, ser vi at et er en forskjell. Innbyggertallet for tettstedet Bjøneroa holder seg relativt stabilt. På Bjønskogen er det en nedgang. Denne er størst i Fjellheim krets. Langs vestsida av Randsfjorden, sør for Bjøneroa, ser vi også en markant nedgang, særlig i Bergheim krets.

Gjennom arbeidet med lokalsamfunnsutvikling i Bjøneroa, har det vært en forståelse av at positiv befolkningsutvikling ikke nødvendigvis bare handler om antall innbyggere, men også sammensetningen av befolkningen. Ønsket om en positiv befolkningsutvikling, har sin bakgrunn i ønsket om å bevare grunnlaget for tjenester til befolkningen. I den forbindelsen er skolen svært aktuell. Tar vi derfor innbyggertall og sammenstiller med elevtall på skolen, får vi et interessant bilde av utviklingen.

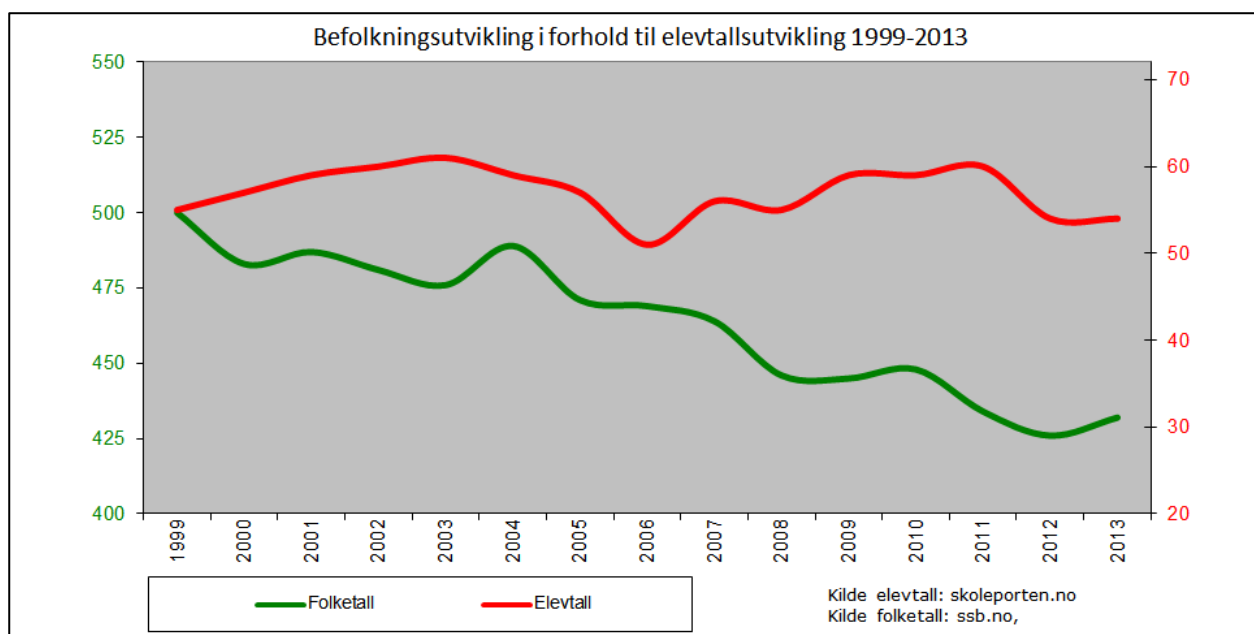

Dette viser at selv om innbyggertall for Bjøneroa viser en negativ utvikling, holder elevtallet på skolen seg relativt stabilt. Det sier antakelig noe om at det er i andre grupper enn barnefamilier befolkningsnedgangen finnes. En nærmere kikk på data for inn- og utflytting antyder at det er blant unge enslige voksne og blant seniorer vi finner det meste av nedgangen.

Statistikk kan som kjent brukes på mange forskjellige måter, og vi skal være varsomme med å tolke alt for mye av den begrensede informasjonen og det beskjedne datagrunnlaget som finnes. Vi går derfor ikke nærmere inn på analyser av befolkningsutviklingen i denne omgang.

Ser vi nærmere på resultater knyttet til delmålene, er det noe enklere å gjøre en vurdering av prosjektet:

- Bjøneroa skal bli verdens første oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn
- Bjøneroa skal utgjøre en forskjell ved å bygge bruer og relasjoner, menneskelig og samfunnsmessig
- Bjøneroa skal bli ei enda bedre bygd å bo i og et enda bedre sted å besøke

Det første målet er vi sikre på å ha oppnådd. Det andre delmålet er ikke så målbart, men sett i sammenheng med omdømmebygging, har vi kommet langt på veg. Det siste delmålet har vi jobbet godt med gjennom flere tiltaksområder. Stedsutvikling handler om å gjøre bygda mer attraktiv. Det er godt å bo et sted hvor folk drar i samme retning og det er stor aktivitet. Mange er stolte av Bjøneroa.

6.2 Vurdering av effekt

Resultatet av småsamfunnsprosjektet er summen av hva alle, som har engasjert seg, har fått til. Som lokalsamfunn har vi fått noen år med fokus på utvikling i stedet for avvikling. Vi har lyktes i å skape forståelse for noen av Bjonerøas utfordringer, samtidig som vi har bygd et positivt omdømme for bygda. Vi har også fått utrettet mye positivt, som vil bety noe for Bjonerøa, både nå og i framtida.

Prosjektledelsen har valgt å vie mest oppmerksomhet til de tiltaksområdene hvor det har vært mest initiativ og energi i arbeidsgruppene. Den største utfordringen underveis har vært å sikre utholdenhet og tålmodighet i prosesser. Det meste har tatt lengre tid enn man har forutsatt, og det har vært en utfordring å holde motivasjonen og interessen oppe blant alle frivillige. Likevel er det mange som har stått på gjennom hele perioden, og det er takket være noen ildsjeler at vi kommer i mål på en god måte.



Lokale ildsjeler har fått ting til å skje.

Innsatsen i småsamfunnsprosjektet har blitt lagt merke til, og andre lokalsamfunn har henvendt seg til Bjonerøa for å få råd om hvordan man kan legge opp et utviklingsarbeid og komme i gang etter modell fra Bjonerøa. Det er fint om erfaringer fra dette prosjektet kan komme andre lokalsamfunn til gode.

Tilsvarende henter Bjonerøa inspirasjon og låner ideer fra andre. Gjennom samarbeidet med LivsVerkene, har denne dimensjonen blitt ytterligere forsterket. Det er viktig å dra nytte og lærdom av gode eksempler og tilsvarende prosjekter som er gjort andre steder i landet.

Omdømmebygging blir nevnt av mange når de skal peke på det viktigste som har skjedd i småsamfunnsprosjektet. Det at Bjonerøa som lokalsamfunn, til tross for sine utfordringer, framstår med positivitet, er viktig. Det går an å bli både hørt og tatt på alvor uten å virke sutrete. Fra lokale politikere og lokale medier merkes en positiv holdning til Bjonerøa, og det er uttalt at dette er et resultat av det som er gjort gjennom Forum Bjonerøa og småsamfunnsprosjektet.



Småsamfunnsprosjektet har gitt folk i Bjonerøa en mulighet til å påvirke utviklingen i bygda si.

Småsamfunnsprosjektet har bidratt til at Bjonerøa på mange måter har bedret sitt forhold til egen kommune. Deltakelse i styringsgruppa fra ordfører og rådmann, har gitt mulighet til å fremme saker, informere, drøfte og skape forståelse. Man kan si det samme om samarbeidet med ulike tjenester innen kommunen.

Det er ikke sånn at alt har gått problemfritt gjennom hele prosjektperioden. Det har også vært slik at noe av det man har jobbet med, har vært omdiskutert lokalt. Men, vi kan likevel si at de fleste prosjektdeltakerne har vært flinke til å takle motgang og meningsforskjeller. Fra prosjektets side har det vært viktig med åpne prosesser og muligheter til medvirkning for de som ville. De som har hatt motivasjon for å engasjere seg frivillig, har fått muligheten til å bidra.

Det er vanskelig å si noe om hvilke forventninger folk i og utenfor Bjøneroa har hatt til dette prosjektet. Om folk opplever at prosjektet har vært vellykket eller ikke, avhenger vel nettopp av hvordan forventningene var. Mange har hatt ulike ambisjoner på vegne av lokalsamfunnet. Et annet interessant spørsmål i denne forbindelsen er, hvordan hadde ting vært i Bjøneroa i dag, om prosjektet ikke hadde blitt satt i gang?

En annen svært positiv effekt av innsatsen som er gjort de siste årene, er at bevisstheten rundt lokal identitet har blitt forsterket. Folk i alle aldersgrupper viser at de er stolte av å høre til i Bjøneroa.

Det må også kunne nevnes som en positiv effekt at mange har hatt det mye moro underveis. Oppmuntringssaken har forløst energi og positivitet, og er et spor som Bjøneroa bør fortsette å følge.



Selv om det ikke har vært mangel på utfordringer for BrubyggerBygda....



....har det vært mye moro underveis.

6.3 Videre anbefalinger

Det er viktig at avrundingen av småsamfunnsprosjektet ikke betyr at engasjementet rundt lokalsamfunnet Bjøneroa avtar. Arbeidet videreføres i Forum Bjøneroa. Mange av de sakene det har vært jobbet med, har et svært langsiktig perspektiv, og vil trenge oppfølging i mange år framover. Fra småsamfunnsprosjektets side er det derfor viktig å peke på noen konkrete anbefalinger i forhold til videre arbeid:

- Forum Bjøneroa drives videre som en interessegruppe og frivillig organisasjon. Det må jobbes aktivt med rekruttering av ressurspersoner som vil jobbe med lokalsamfunnsutvikling. Stedsutvikling og omdømmebygging bør fortsatt være viktige satsningsområder.
- Videreføring av stedsutviklingstiltak som et samarbeid mellom Gran kommune og Forum Bjøneroa. Gjenstående midler overføres til 2014. Kommunen viderefører sin rolle som tiltakshaver. Forum Bjøneroa bidrar med dugnadsinnsats og anleggsbidrag fra egne innsamlede midler.
- Områdereguleringsprosessen må følges opp helt til et gyldig vedtak foreligger.
- Fra og med 2014 innføres halvårlige møter mellom styret i Forum Bjøneroa, rådmann og ordfører. Møtene avholdes i mars og september. Forum Bjøneroa har ansvar for innkalling. Ordfører og rådmann inviteres fortsatt til det årlige Bjøneroatinget.
- Gran kommune og Forum Bjøneroa avklarer forhold rundt drift av Stilla Elvepark og framtidig tursti/strandpromenade, med tanke på å oppfylle forpliktelser som ligger i avtaler med grunneiere.
- Forum Bjøneroa og Gran kommune jobber sammen for å sikre framtida for fritidstilbudene for ungdom i Bjøneroa.

6.4 Konklusjon

Gjennom småsamfunnsprosjektet er det etablert et samarbeid mellom Forum Bjøneroa og Gran kommune som skal vare inn i framtida. Det er viktig å ta vare på livskraften, engasjementet og dugnadsånden som bor i Bjøneroa. Dette bygdesamfunnet har sine spesielle utfordringer og muligheter, som Gran kommune fortsatt skal ta ansvar for sammen med innbyggerne.

Det systematiske arbeidet og de kreative prosessene som har funnet sted i Bjøneroa de siste årene, viser at man kan få til mye - når forholdene blir lagt til rette og ressurser blir tilført. Småsamfunnsprosjektet er gjennomført i tråd med forutsetningene, og har bidratt til å føre lokalsamfunnet i riktig retning. Det rettes en stor takk til alle som har bidratt.

Gran rådhus, 8. januar 2014

Styringsgruppe:
Anne Hilde Sørum
Knut Magnar Lehre
Arne Skogsbakken

Prosjektleder:
Ellen Sagengen

Vedlegg

Vedlegg 1

Kilder og tilleggsinformasjon

Oversikt over bakgrunnsstoff tilgjengelig på nett

Vedlegg 2

Presseklipp

Avisartikler om småsamfunnsprosjektet

Vedlegg 3

Fotoalbum

Bildeminner fra prosjektperioden

Mer informasjon:

Lenke 1

Hjemmeside for småsamfunnsprosjektet:

<http://www.bjoneroa.no/index.php?pageID=95&page=smasamfunnsprosjektet>

Lenke 2

Stedsutviklingsskisse, utarbeidet av Rambøll 2008:

http://www.bjoneroa.no/files/2009/02/ramboll_utviklingsskisse.pdf

Lenke 3

Områderregulering, behandling i planutvalget 27. november 2013, sak 49/13:

<http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/Politikk/Sakspapirer/Sakspapirer-2013/Planutvalget/>

Lenke 4

Bygg og bo i Bjoneroa:

http://www.bjoneroa.no/index.php?pageID=109&page=bygge_og_bo

Lenke 5

Ledige tomter på Hadeland:

<http://ledigtomt.no/boligtomter/gran-kommune/haug-tomtefelt/>

Lenke 6

Oppmuntringssertifisering av Bjoneroa:

<http://www.bjoneroa.no/index.php?pageID=146>

Lenke 7

Mulighetsanalyse for bru over Randsfjorden:

<http://www.bjoneroa.no/index.php?pageID=155>

Lenke 8

Faceboosiden «Drømmen om bru over Randsfjorden»:

<https://www.facebook.com/BruOverRandsfjorden>

Lenke 9

Bjoneroa.no på Facebook:

<https://www.facebook.com/bjoneroa.no>

Medieklipp:

Faksimiler fra Hadeland, Oppland Arbeiderblad og NRK

Bilder:

Brubilde side 1 og 6:

Foto og redigering: Kari og Stein Korsmo

Kart og illustrasjonsskisse side 12 og 13:

Rambøll, Lillehammer

Bilde side 15:

Foto: Heidi S Wilhelmsen

Alle øvrige bilder:

Foto: Kari og Stein Korsmo, Ellen og Tommy Sagengen



THURSDAG 1. APRIL 2010 • KR. 66 • 38. årgang • Utsendingsnr. 20 • www.hedeland.net

BSU 4%

SpareBank 1 Grønt

Spørsmål

Gir seg etter 4.000 timer

Trussel for anestesibestanden, som driver barne- og jenteklinikkene i Helse Rikshospitalet, gir seg etter fem år med knusende arbeidsbelastning.

Halve Haplo på startstreken

Helt Sundvold og Haplo Høien er to av de 24 påmeldte i Vågaløpet fra Haplo.

Konflikter i hyttefeltet



Ledig stilling som snorklipper

Lærne er villig, men oppmuntringsagent Olga Elisabeth Tøkerud lover både godt med je og grundig opplærings og rår Bjønneroa søker etter offisiell snorklipper.

Toyoda Hedeland AS

Toyoda Håkon er Norges mest solgte varebilselskap. 3000. Fordig bil i 10. uke i april 2010. 10. 00. 30. 40. 70. • www.toyoda.no

Ukens Go!-produkt

hverdags og forbruk

1490

Fastpris for 1000 stk. 1490

Spørsmål til produsenten eller forhandleren

Gleder seg til skolestart ved nyskolen

Ida Andreassen og Malin Hestmarken fra Lærne skal begynne på nye Hestmark videregående skole 1. august 2010, som elever i skolestart. Ida, som har vært i 10. klasse, og Malin, som har vært i 11. klasse, er begge glade for å starte på skolestart.

Gode vibber på vestsida

Bjønneroa

De slykkes seg med like som vakkert, oppmuntringsagent og alumnus. Vernearbeid til videre ferdig oppmuntringssertifisert lokalsamfunn.

Oppmuntringssertifisert

Oppmuntringssertifisert lokalsamfunn



Skolestart

Ida Andreassen og Malin Hestmarken fra Lærne skal begynne på nye Hestmark videregående skole 1. august 2010, som elever i skolestart. Ida, som har vært i 10. klasse, og Malin, som har vært i 11. klasse, er begge glade for å starte på skolestart.

Knaute ruter

Knaute ruter

Spørsmål

Gir seg etter 4.000 timer

Trussel for anestesibestanden, som driver barne- og jenteklinikkene i Helse Rikshospitalet, gir seg etter fem år med knusende arbeidsbelastning.

Halve Haplo på startstreken

Helt Sundvold og Haplo Høien er to av de 24 påmeldte i Vågaløpet fra Haplo.

Konflikter i hyttefeltet



Snorklipper på plass

■ Prøveklippet gjenåpning av postkasse ■ Første oppdrag lørdag

Lørdag åpner Kari Kjørmo «AnnaTØRstivelsen»

På scenen står blant andre Ellen Sagengren og skal danse ballett fra Svane-sjøn.

DETTE ER SAKEN

Det er et tilbud som agenter i 10 år har jobbet med. Det er et tilbud som agenter i 10 år har jobbet med. Det er et tilbud som agenter i 10 år har jobbet med.

Byttehandel

Hun står seg først avende til tilbudet, men snart blir hun opptatt av det nye tilbudet. Hun står seg først avende til tilbudet, men snart blir hun opptatt av det nye tilbudet.

Gleder seg til skolestart ved nyskolen

Ida Andreassen og Malin Hestmarken fra Lærne skal begynne på nye Hestmark videregående skole 1. august 2010, som elever i skolestart. Ida, som har vært i 10. klasse, og Malin, som har vært i 11. klasse, er begge glade for å starte på skolestart.

NRK

Hedmark og Oppland

05.09.2010

De mest positive i landet?



Oppmuntringssertifisert

Oppmuntringssertifisert lokalsamfunn

Bjønneroa i Gran kommune er det første stedet i landet som er oppmuntringssertifisert. Her oppfordres alle til å være glade og rose hverandre.

Kathrine Linde HALLVORSEN

ANNE MARIE HVALTUM

Publisert 26.06.2010 14:31.

I den vesle grenda er det tydelig at alle prøver å være blide. Her er det i underkant av 200 husstander, og nesten alle postkassene har klistermerke med smilefjes på.

– Det er frivillig om folk vil være med på dette, men vi kjøpte 200 klistermerker og har bare 20 igjen. Så det er tydelig at folk liker dette, sier primus motor Ellen Sagengren.

Først ut i landet

Bjønneroa i Gran kommune er det første stedet i landet som er oppmuntringssertifisert. De skal ikke bare si hyggelige ting til hverandre, de skal også skrive det ned.

I en egen oppmuntringspostkasse kan den som vil legge en hilsen til en medbygger. Og alle oppfordres til å glede andre med ros eller klapp på skulderen.

– Blir vi oppfattet som tullebukker så går det fint. Vi er ikke selvhøytidelige. Det skal jo være morro dette her, sier Roar Engesbakken.

Oslo har mye å lære

Innbyggerne her har troen på at det hjelper å ha fokus på oppmuntring.

– Jeg prøver å være mer bevisst i forhold til det positive og hvor bra vi har det. Jeg gir flere oppmuntringer enn før, sier Ellen Sagengren.

Karin Venåsén flyttet hit etter 28 år i Oslo. Hun mener miljøet på Bjønneroa er helt spesielt.

– Jeg ble veldig overrasket når jeg flyttet hit. Folk viser stor interesse

Hadeland

Etablert 1918

Ansvarlig redaktør/daglig leder: **Bjørn Harald Blak**
Utgiver: A/S Hadeland • Sentraltbord 61 31 31 31 • Trykk: Nr.1 Trykk A/S avd. Gjøv

Leder

Så mye morsommere enn å surve og klage

Alt går så mye lettere og bedre med humor. Det har de skjont i Bjonerøa, og de vet å benytte seg av det. Sjelden har vel flokken av positive bølgjer i og fra Bjonerøa vært større enn etter at humoren ble satt i system.

Historien om den lille og søvnige bygda Næroset er etter hvert godt kjent. Det som for var ei bygd som så mange andre norske bygder, som slet med fralting og frustrasjon, har skiftet navn til Lucky Næroset. Ledet an av idkjerler som nekter å se annet enn positivt på tingenes tilstand drar de hele bygda med seg. De problemene som måtte finnes overskygges av positive tiltak, påfunn og ideer.

Historien om Næroset har blitt en eneste stor solskinnshistorie, og nå reiser folket fra Næroset Norge rundt med sine ideer og tanker. De inspirerer, og stadig flere plukker opp ideene og gjør dem til noe unikt. I Bjonerøa har de virkelig fått det til, og på lørdag debuterer fast ansatt snorklippere med sitt første offisielle oppdrag. Da åpner Kari Korsmo «AmmaTORifestivalen». På scenen står blant andre Ellen Sagengen i ballettut, og skal danse fra Svanesjøen. Det er nok flere enn Sagengen som kommer til å tørre.

Det bor det utroligste i oss, men det kommer sjelden til syne fordi vi også har en hel haug med filtre i personligheten vår. Alkohol har det med å svekke disse filtrene, på godt og vondt. Vi har alle sett det hos de bedugede menneskene, i form av overraskende atferd. Vi sier til og med at enkelte ikke tør opp for de får seg noe innabords. Heldigvis er ikke alkohol løsningen, men det viser poenget at det bor mer i oss enn det vi tør vise fram. Og med det er vi ved kjernen: Å tørre.

Vi er i altfor stor grad opptatt av å gjøre det som er fornuftig og «riktig». Vi er altfor opptatt av å ikke dumme oss ut, og å ikke skille oss ut. Det er den typen filter som skaper problemer for oss. Det sies at lediggang er roten til alt vondt, men vi skal ikke undervurdere kos med misnøye heller. Det er lett å være enige om ting som ikke er bra. I stedet for å tenke ut hva vi kan gjøre med det, finner vi sammen i et fellesskap der vi lar feilen være sentrum. Det er mulig det er sosialt og trivelig, men det gjør ingenting for å fjerne feilen eller å gjøre det bedre rundt oss.

Strategien minner om liknelsen med sola og vinden som kaptet om hvem som kunne ta av et menneske jakka raskest. Vinden provde med brutal kraft, men måtte gi opp. Sola vant gjennom å spre varme. Bjonerøingene, som alle andre nordmenn, kan finne nye å både være sinte på og frustrerte over. I stedet for å bruke energien på det negative, velger de å snu på flisa. Det er det vi ser resultater av nå, og det må være mye morsommere enn å klage. Smil og humor er som et tryllestøv. Kaster vi det over noe eller noen, snus tungsinnet til smil og latter, for smil, det smitter.

Vil ha seil inn-brygge i Bjonerøa

De var ikke så mange, men de hadde flere kreative ideer om hva som skal til for å få mer næringsvirksomhet i Bjonerøa.

MERETE PRESTIKVERN
mp@hadeland.net • 99 64 208

BJONERØA: Forum Bjonerøa og samarbeidsprosjektet inviterer til helgen til åpent møte i kulturbygget om næringsutvikling på vestkysten av fjorden.

Er det interesse for tiltak i Bjonerøa, spurte Ellen Sagengen, og fikk flere forslag som svar. Alle med utgangspunkt i ei ordentlig brygge så fridagsbåtene kan legge til kai. Seil innkino, friluftskonsert for bilene på fjorden, bryggedans og regatta var noen av forslagene som kom. Et annet innspill var bedre infrastruktur. I tillegg ble det vurdert å bygge en seilbrygge.

«Det er et initiativ for å bygge en seilbrygge i Bjonerøa»,



MANGE INNSPILL: deltakerne på det åpnet møtet om nærings i Bjonerøa kom med mange innspill. Fra venstre Ellen Sagengen, Hans Olav Tokrud, Lars Olav Habbestad, Birger Sæthorn og Terje Haugen.

Gaveutdeling

Hadeland

Etablert 1918

Ansvarlig redaktør/daglig leder: **Bjørn Harald Blak**
Utgiver: A/S Hadeland • Sentraltbord 61 31 31 31 • Trykk: Nr.1 Trykk A/S avd. Gjøv

Leder

Blir ikke du i godt humør også?

Det er noe befriende med positive mennesker. De er trivelige å være sammen med, og deres holdninger smitter. Det blir også litt lenger mellom problemene når du har et smil om munnen.

Vi møter alle problemer, eller utfordringer som de vel heller skal kalles. I Bjonerøa har de bestemt seg for å møte dem på en positiv måte. De vil ikke sitte og vente på at positive ting skjer av seg selv. Prioritet blir derfor å skape de positive tiltakene selv, rikelig krydret med humor og galskap. Derfor utlyser de nå ledig stilling som snorklippere i bygda. Daglig Gleder Olga Elisabeth Tokrud bobler over av smil, humor og iver, og gleder seg nok til søknadene etter hvert renner inn.

I Bjonerøa har de satt seg fore å skape overskrifter, ikke underskrifter. Det er klokskap i slikt. Underskriftskampanjer har noe positivt ved seg, men nyskaping og glede blir det ikke av det. Der har overskrifter mye større verdi. I går greide de på nytt å skape overskrifter i media. Her i avisen fikk de til om med hovedoppslaget på forsiden. Så lenge budskapet er positivt er det strålende reklame, denne gangen for Bjonerøa. Det bygger et positivt rykte for Bjonerøa, og det er nok et godt argument for å reise dit, skape noe der, eller kanskje flytte dit. Vi får jo et bilde av Bjonerøa som et sted der det er morsomt og trivelig å være. Kanskje har vi også blitt imponert over hvor lite surving det faktisk har vært der, til tross for at ferga i det siste har ligget mer til reparasjon enn den har vært i trafikk.

Bjonerøa er et sted som er vel-signert med positive og konstruktive innbyggere. De har også de viktige «bjellesaene». De drar bygda i riktig retning. Når de nå i tillegg har lært av historien til Lucky Næroset, og adopterer deres virkemidler, kan vi forvente ytterligere suksess.

Denne positive tilnærmingen er ikke bare noe for små bygger som vil snu en eventuell negativ trend. Galskap, humor og positivitet ligger i grunnmuren til svært mange suksesser, både i næringslivet, i idrettslag, i vennekretser, ja over alt. Positivitet er rett og slett en universell suksessfaktor.

Å peke på det som ikke fungerer, er den letteste sak i verden. Å få noe til å virke, og å få det til å virke positivt er mer vrient. Første bud er å erkjenne at du ikke kan vente på at noe positivt skal skje. Du må bidra. Vi kan ikke nøye oss med å peke på det som ikke virker. Vi må lete etter hva vi kan bidra med for at det skal bli bedre.

Altfor mange bruker energi på å peke på hvem det er sin skyld at vi ikke får gjort jobben vår. Vi skulle i stedet spørre oss selv hva vi kan gjøre for at andre kan gjøre jobben sin. Det arbeidet blir mye lettere med litt humor og galskap. Derfor virker det med daglig gleder, snorklippere, og muntrasjonstilsyn, slik som i Bjonerøa.

Hadeland

Etablert 1918

Ansvarlig redaktør: **Sissel Skjervum Bjørkehagen**
Daglig leder: **Karl Framstad Lekrheim**
Utgiver: A/S Hadeland • Sentraltbord 61 31 31 31 • Trykk: Nr.1 Trykk A/S avd. Gjøv

Leder



OPPMUNTRINGSINSPEKSJON: Selv om det var godt humor under inspeksjonen av ferga, delte Ellen Sagengen noen alvorlige forordninger med fergeutfordringene. Sagengen er leder i Forum Bjonerøa.

Alvorlig oppmuntring fra engasjerte innbyggere

Nok en gang ble det invitert til et arrangement med positivt vri i Bjonerøa. Denne gangen var det innbyggernes uhøytidelige inspeksjon av ferga, som tidligere i sommer har vært inspirert av langt strengere instanser.

Det ligger et visst alvor bak markeringen. Inger Luneng framstår blid og jovial på bildet avisen i går brakte fra innbyggernes inspeksjon av Randsfjorderga. Samtidig forteller hun at arbeidsvegen for hennes del har vært sju mil lenger hver eneste dag i perioden hvor ferga har vært ute av drift.

Det er lett å skjønne at det påvirker hverdagens logistikk.

Det har kostbare konsekvenser når ferga av forskjellige grunner ikke kan gå som planlagt.

Randsfjorderga er viktig for kommunikasjonen mellom øst- og vestsida. Den angår både unge, middelaldrende og eldre. Det har kostbare konsekvenser når ferga av forskjellige grunner ikke kan gå som planlagt.

Ved innledningen av inspeksjonen ble det presentert tre krav som ifølge initiativtakerne bør formidles til Oppland fylkeskommune. Kravene kan etter vår oppfatning innarbeides som fylkeskommunens mål for ferge driftens de har ansvar for.

Bjonerøingene mener at når ulike tilsynsmyndigheter etterspør og kontrollerer ulike sider ved ferge driftens, skal de finne alt på stell. Alle skal være trygge på at fergen drives i tråd med gjeldende krav. Bjonerøingene mener politisk ledelse i Oppland fylkeskommune må vise tydelige forventninger til kvaliteten og stabiliteten i ferge tilbudet, og dersom man opplever at gjeldende krav er urimelige eller uhensiktsmessige, er det i så fall det man må ta tak i.

Vi håper Oppland fylkeskommune lytter til sindige bjonerøinger, og tar med seg kravene de har fått presentert. Kravene er rimelige, og forståelige. Det kan ikke fortsette slik at tilsynsmyndighetene finner uregelmessigheter som krever driftsstans hver gang de ankommer ferga. Til det er transportøren alt for viktig i mange folks hverdag. Alternativet er bru. Til nå har ikke det framstått som realistisk.

■ Diskuter lederen på www.hadeland.net/debatt

pressens faglige utvalg
PFU
Hadeland er en partipolitisk uavhengig lokalavis for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Avisen skal bedrive saklig, troverdig og uavhengig journalistikk med høy etisk standard basert på Vær Varsom-plakaten.
Klager kan rettes til ansvarlig redaktør, eller til Pressens Faglige Utvalg (PFU), Rådhusgata 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 40 50 55. E-post: pfu@pressa.no

BJONERØA

Stell på ting i Bjonerøa

Kampanje
Fra kl. 12.00 til kl. 14.00
Hver uke en gave til alle som kjøper en kaffe i kafeen.

Ansvarlig redaktør
Sissel Skjervum Bjørkehagen
Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 40 50 55. E-post: pfu@pressa.no

Bjonerøa Byggeservice
Alt i forbindelse med bygging og reparasjon
Byggeservice
Haugen, 1000, 1000
Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 40 50 55. E-post: pfu@pressa.no

Ansvarlig redaktør
Sissel Skjervum Bjørkehagen
Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 40 50 55. E-post: pfu@pressa.no

Ansvarlig redaktør
Sissel Skjervum Bjørkehagen
Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 40 50 55. E-post: pfu@pressa.no



Det gjelder å ikke la fortvilelsen ta overhånd når ferja står. Her utprøves reservefarkost, som viste seg å være noe tvilsom. En tragisk situasjon takles med humør, sommeren 2009.



Dugnad er slett ikke så traurig som noen skal ha det til. Her er det støping av fundamenter til paviljong i Stilla som foregår, oktober 2013.



Ordfører Inger Staxrud ønsker Småsamfunnsprosjektet lykke til, Kick-off februar 2008.



Bjoneroa viste seg fram på Hadelandsmessa, november 2009.



AmmaTØRfestivalen, september 2010, ble et vellykket arrangement. Her fikk flere vist fram skjulte talenter.



Den aller første snorklipping, juli 2010. Endelig fikk Bjoneroa ansatt sin egen snorklipper.



Den som hjelper til med å flytte matjord, fortjener kake i pausa. Tre unge dugnadshelter, oktober 2013.



Rockeskole en helg i februar 2012. Et samarbeid mellom Småsamfunnsprosjektet og Hadeland Kulturskole, hvor Adam Douglas Envoldsen lærte lokale barn og unge grunnleggende ferdigheter.



Fotoutstillingen «Liv Laga» ble første gang satt opp sommeren 2009. Her er det dugnad med montering i juni 2011.




Bygdekveld utenom det vanlige med motarbeider Halvor Haukerud, mars 2011. Han gjorde det han kunne for å dra ned stemningen.



Lokale oppmuntringsagenter representerte Bjonerøa under samling for virksomheter under oppmuntringssertifisering. Senja, september 2010.



«From Bjonerøa with love». Overraskelsesbesøk i kommunestyret, september 2010. Anonyme oppmuntringer fra Bjonerøa ble delt ut til alle som var til stede i kommunestyremøtet.

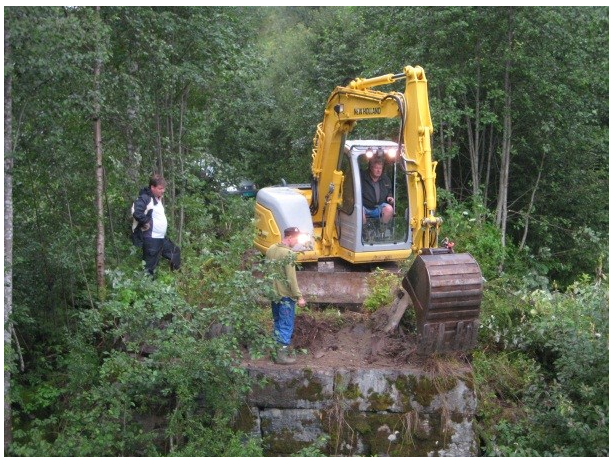

Rydding av vegetasjon rundt brukarene i Stilla, august 2009.



Åpent møte med tema «Ung i Bjonerøa», våren 2011.



Denne brua, som har en historie fra Aker Brygge i Oslo, har fått et nytt liv i Bjonerøa. Tilfeldigheter og flaks har blitt en god historie.



Takket være at Bjonerøingene mye god kompetanse og tilgang til forskjellig maskiner og utstyr, kunne en relativt komplisert prosess løses med lokale krefter. Brua heises på plass i Stilla Elvepark, juli 2010.



Etter tre år med fotoutstillingen «Liv Laga», ble den etterfulgt av «Sånn var'e». Her gjøres det klart til åpningen sommeren 2012.



Status som verdens første oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn medfører en del representasjon. Her er det NAV Ringsaker som blir sertifisert og blir stolt innehaver av en bit av stamsnella fra Bjonerøa.



Slentring og mat er viktig i utviklingsprosesser. Bjoneroa valgte å ta tak i oppmuntringssaken etter Bygdelivsverksted, april 2009.




26. juni 2011 arrangerte oppmuntringsagentene i Bjoneroa Jubeldag med hemmelig gjest med stor sjekk, hele tre snorklippinger og piknik.



Rydding og flytting av utstyr i Bjoneroa kulturbygg, sommeren våren 2010. Dette var nødvending både for å få til «nytt» ungdomslokale og ombygging av scena.



Innkalle til møter, er en måte å skape medvirkning på. Ut å møte folk er en annen. Her har Forum Bjoneroa og småsamfunnsprosjektet informasjonsstand utenfor Bjoneroa Handel, august 2009.

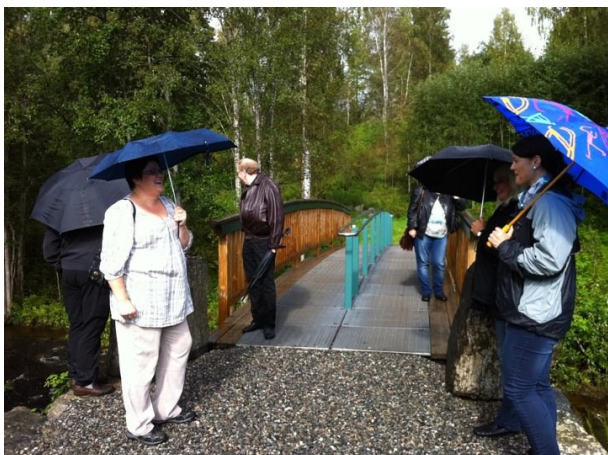

Nøkkelpersoner i Gran kommune på befarung for å bli kjent i Bjoneroa, september 2011.



LivsGnistrer Tom Åge Myhren på oppmuntringskveld i Bjoneroa, september 2009. Her ble det besluttet å gå for å bli verdens første oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn.




Sightseeing i forbindelse med Livskraftutveksling i Bjønroa. Folk fra alle kanter av landet kom for å bli kjent med Bjønroa, 26.-27. juni 2010.



Gjestene ble bydd en kummerlig lavvoovernatting og måtte selv padle til leirplassen. Men Fjorda viste seg fra sin aller vakreste side under livskraftutvekslingen.



Inspirasjonsseminar om omdømmebygging i regi av Distriktsenteret, februar 2010. Småsamfunnsprosjektet i Bjønroa var lokal arrangør.

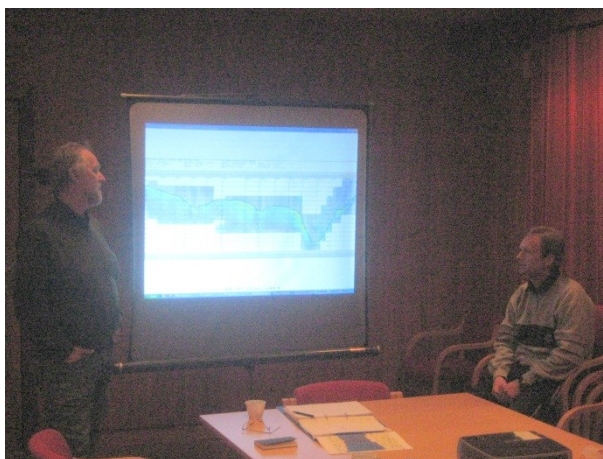

Arbeidet med mulighetsanalyse for bru over Randsfjorden har blitt støttet økonomisk av småsamfunnsprosjektet. Her fra et arbeidsmøte i februar 2010.



Kaffeslabberas i forbindelse med ryddedugnad i Stilla, april 2011.



Humørbonde Geir Styve holder inspirerende innlegg om oppmuntring i forbindelse med en orientering i kommunestyret, høsten 2009.



En god dugnad inneholder nyttig arbeid, kaffe med hjemmebakst og en dose tullprat.



Brubbyggere med velfortjent kaffepause, sommeren 2010.



Frokost i det grønne, mens man lytter til NRK Reiseradioens reportasje om verdens første oppmuntringssertifiserte lokalsamfunn. Fjorda, 27. juni 2010.



Stamsnella for oppmuntring har sin genesis i forbindelse med at Bjonerøa ble oppmuntringssertifisert. Den er sikret bak lås og slå.



Fra den første og eneste offentlige visningen av stamsnella, 26. juni 2011.



Denne fotogruppa ble til gjennom småsamfunnsprosjektet. Interessant kreativ prosess førte til deltakelse på UKM, januar 2010.



Kulturelle aktiviteter som fenget et mer voksent publikum. Linedancekurs, april 2008.



En kulturgruppe for barn og ungdom, som var veldig populær, var dramagruppa. Her bidrar de med underholdning på juletefeste, desember 2008.



Blide oppmuntringsagenter som i høyeste grad har bidratt til at Bjønroa ble oppmuntringssertifisert. Dette er like før den gripende sertifiseringsseremonien, 26. juni 2010.



Referansegruppemøte på Gran rådhus, april 2010.



Ungdommene i Bjønroa bidro selv med dugnadsinnsats for nye ungdomslokaler. Dette er fra høsten 2010.



Småsamfunnsprosjektet satset på kultur og fritidsaktiviteter. Bjønroaungdommer på scenen under UKM, januar 2010.

